

## **Voortgangsrapportage 8 PMR Natuurcompensatie**

Natuurcompensatie behorende bij de landaanwinning  
Maasvlakte 2

Datum	02 september 2010
Status	Definitief

## **Voortgangsrapportage 8 PMR Natuurcompensatie**

Natuurcompensatie behorende bij de landaanwinning  
Maasvlakte 2

Datum	02 september 2010
Status	Definitief

## Inhoud

<b>1. NATUURCOMPENSATIE MAASVLAKTE 2</b>	<b>4</b>
1.1 inleiding	4
1.2 belangrijkste conclusies	5
<b>2 VOORTGANG OP DE ONDERDELEN DUINCOMPENSATIE/ZEEREEP</b>	<b>5</b>
2.1 Locatie	5
2.2 Duincompensatie	6
2.3 Gerealiseerde mijlpalen	6
2.4 Risico's	6
<b>3 NATUURCOMPENSATIE IN DE VOORDELTA, MIDDELS BODEMBESCHERMINGSGEBIED MET RUSTGEBIEDEN</b>	<b>7</b>
3.1 Lokatie	7
3.2 Monitoring- en Evaluatieprogramma (MEP)	8
3.3 Risico's	8
3.4 Planning	9
3.5 Scope/doelstellingen	9
3.6 Financiën	9
3.7 Organisatie/kwaliteit	10

## 1. Natuurcompensatie Maasvlakte 2

### 1.1 *inleiding*

De aanleg van de landaanwinning Maasvlakte2 heeft mogelijk schade aan de natuur tot gevolg; deze schade wordt middels een aantal maatregelen gecompenseerd. Deze zogeheten natuurcompensatie bestaat uit 2 zelfstandige onderdelen: de Duincompensatie (en het daarbij behorende onderdeel 'Zeereep') en de natuurcompensatie in de Voordelta. In VGR 6 is gemeld dat de zeereep definitief niet nodig is. Daarom wordt hier verder geen aandacht meer aan geschonken.

De Duincompensatie Duinen van Delfland ligt ter hoogte van de Delflandse kust.

De natuurcompensatie middels een Bodembeschermingsgebied met de rustgebieden ligt in de noordelijke helft van de Voordelta.

Voor beide onderdelen is een monitoring- en evaluatieplan (MEP) opgesteld en voor het bodembeschermingsgebied wordt gewerkt op basis van dit plan. Voor de Duinen van Delfland is in deze verslagperiode een aanbesteding gehouden om op basis van het MEP te gaan meten en monitoren. Op basis van de aanbestedingsresultaten is de opdracht gegund in deze verslagperiode. Tevens wordt door de beheerder gemeten wat de ontwikkelingen zijn.

De verslagperiode loopt van 1 januari 2010 tot 1 juli 2010.

### 1.2 *belangrijkste conclusies*

Sinds deze verslagperiode is de aanleg- en realisatiefase van de natuurcompensatie afgerond. Dat betekent dat er een volgend stadium aanbreekt, namelijk de natuurlijke ontwikkeling van het gebied. Voor de achterliggende periode worden hieronder de belangrijkste conclusies gemeld.

- de natuurcompensatie is tijdig gerealiseerd.
- de natuurcompensatie is juridisch onherroepelijk, omdat alle bezwaarprocedures zijn afgerond en er geen beslissingen op bezwaar zijn die nopen tot aanvullende werkzaamheden.
- de belangrijkste risico's zijn hiermee verdwenen. De resterende risico's hebben te maken met het uiteindelijk te bereiken doel en daar zijn nog vele jaren mee gemoeid. Door continue monitoring en periodieke evaluatie worden deze gemanaged.

## 2 Voortgang op de onderdelen Duincompensatie/Zeereep

### 2.1 Locatie

Duincompensatie Duinen van Delfland

Onderstaande figuur 1 laat de locatie zien waar de duincompensatie in combinatie met de versterking van de zwakke schakel Delfland zijn aangelegd.



Figuur 1: Locatie duincompensatie Delflandse Kust en zwakke schakel Delfland.

## 2.2 *Duincompensatie*

De aanleg van de Duincompensatie is in de verslagperiode van VGR6 gerealiseerd.

Stichting Het Zuid Hollands Landschap is beheerder van het gebied voor de komende 30 jaar. Het gebied is overgedragen op 1 juli 2009. Het proces van in- en uitstuiven is inmiddels in volle gang en wordt gevolgd middels monitoring. Het gebied zelf is niet toegankelijk voor het publiek en kan alleen via de strandslagen worden gepasseerd.

Het Monitoring- en Evaluatie Programma (MEP) voor de duincompensatie is in de verslagperiode aanbesteed en gegund. Dit is in samenhang met overige onderdelen van PMR opgezet. Uitvoering van dit MEP start in de volgende verslagperiode.

Op 2 maart 2010 is het eerste deel van de nieuwe permanente bebouwing op de zeereep (het combigebouw) overgedragen aan de Kustzeilvereniging 's Gravenzande.

Op 17 maart heeft de formele overdracht naar de gemeente Westland van het beheer van de strandslagen, alsmede het eigendom van het gebouw ten behoeve van de Reddingsbrigade, alsmede de bijbehorende kabels en leidingen plaatsgevonden.

De oude gebouwen (strandpaviljoens) zijn gesloopt.

Op advies van de begeleidingscommissie is besloten het basisduin voorlopig niet aan te passen en in 2010 ook geen helm te laten planten door de aannemer.

Inmiddels is geconstateerd dat strandhuisjes die in het zomerseizoen ten zuiden en voor een klein deel ten noorden van de duincompensatie staan mogelijk van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk te bereiken habitatype. Daarom is een onderzoek gestart en is de begeleidingscommissie aan de slag gegaan met dit onderwerp. Zij zullen in 2010 een advies uitbrengen aan de beheerder van de duincompensatie. Verder is een onderzoek gestart naar een eerdere, en zo mogelijk, zwaardere juridische vorm van bescherming van het aangelegde gebied. Tenslotte zal de aanvraag voor de vergunning om de funderingen van de strandhuisjes het hele jaar te laten liggen en het aantal uit te breiden niet worden verleend.

In de volgende verslagperiode zal hierover meer worden gerapporteerd.

## 2.3 *Gerealiseerde mijlpalen*

Aanbesteding van de monitoring van de Tnul situatie van de bestaande duinen voor wat betreft de NOx depositie.

## 2.4 *Risico's*

Als blijkt dat de strandhuisjes een risico vormen voor het uiteindelijk te bereiken habitatype, zullen maatregelen getroffen worden. Welke maatregelen is op dit moment nog niet te zeggen, eerst moeten de resultaten van het onderzoek de naar de beschermingsstatus en naar de effecten van de huisjes worden afgerond.

### 2.4.1 *stand van zaken eerder geconstateerde risico's*

#### *Onvoldoende behalen van de compensatieopgave Duincompensatie*


Alle activiteiten zijn er op gericht om het gerealiseerde aanleg-resultaat zich te laten ontwikkelen in de gewenste richting. Het MEP vormt de basis hiervoor.

Er is op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat het uiteindelijke resultaat niet gehaald zal worden.

### 3 Natuurcompensatie in de Voordelta, middels Bodembeschermingsgebied met rustgebieden

#### 3.1 Lokatie

Onderstaande figuur 2 laat zien waar het bodembeschermingsgebied met de bijbehorende rustgebieden is gelegen in de Voordelta.

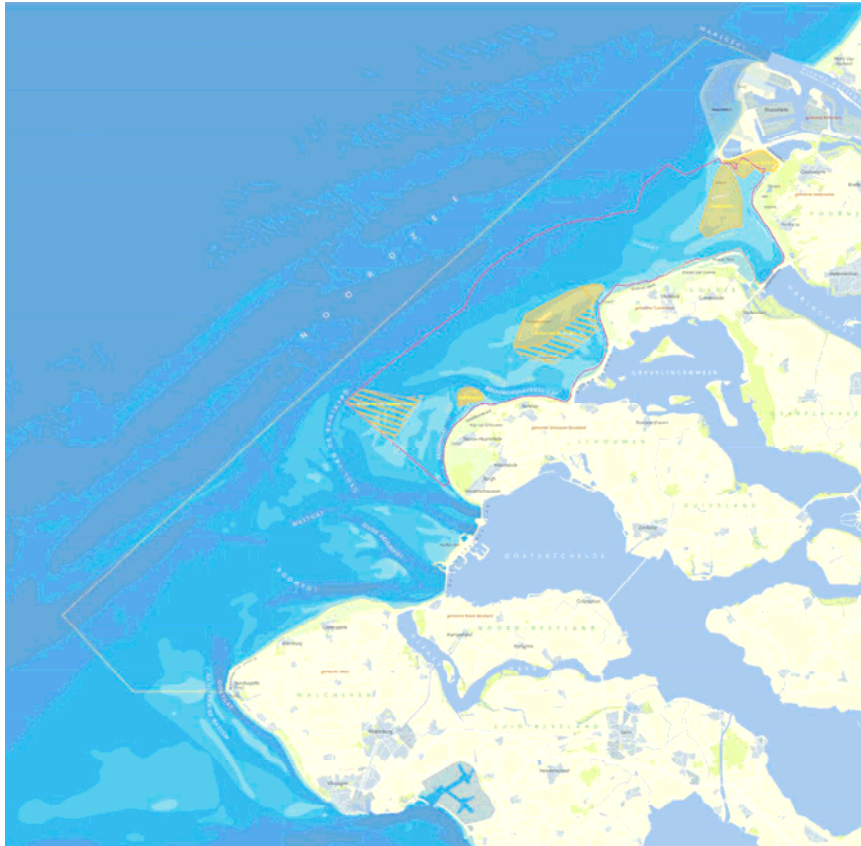

Figuur 2: Voordelta en het daarin gelegen bodembeschermingsgebied (binnen de rode contour) met rustgebieden (gele zones)

De besluitvorming voor het Bodembeschermingsgebied bestaat uit de volgende procedures: het Aanwijzingsbesluit Voordelta en de Toegangsbeperkingsbesluiten.

In het Aanwijzingsbesluit voor de Voordelta zijn de begrenzing en doelstellingen voor de compensatie van de landaanwinning (het Bodembeschermingsgebied met rustgebieden) opgenomen. Het beheerplan Voordelta bevat de achtergrondinformatie voor de toegangsbeperkingsbesluiten, maar is procedureel losgekoppeld.

Alle voor de natuurcompensatie relevante procedures zijn afgerond. Tegen de toegangsbeperkingsbesluiten die gelden voor onderdelen van het Beheerplan Voordelta die buiten de natuurcompensatie vallen liepen nog wel bezwaren.

De zitting bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de verslagperiode plaatsgevonden. Na de verslagperiode (op 21 juli 2010) is bekend geworden dat de bezwaren ongegrond zijn verklaard. Daarmee zijn alle besluiten onherroepelijk en lopen er geen bezwarenprocedures meer tegen de natuurcompensatie.

#### *Aanwijzingsbesluit Natura2000*

Alle relevante A-besluiten zijn onherroepelijk.

#### *Beheerplan Voordelta*

Het beheerplan Voordelta regelt het beheer van de Voordelta in het kader van Natura 2000. Rijkswaterstaat heeft dit samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland opgesteld. Op 21 juli 2008 is het plan gepubliceerd. Tegen het Beheerplan zijn beroepsprocedures ingesteld. De behandeling van deze beroepen heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2009. Op 16 december 2009 heeft de Raad van State alle beroepen niet ontvankelijk c.q. ongegrond verklaard. Daarmee is het beheerplan Voordelta onherroepelijk geworden in de vorige verslagperiode.

Het Beheerplan Voordelta is in uitvoering sinds zomer 2008. De uitvoeringsorganisatie is vanaf die periode operationeel. Het gebied is ingericht, onder meer met betoning en bebording. Communicatie, toezicht en handhaving richten zich zowel op het naleefgedrag (van maatregelen) van het publiek als op het onderhouden van het draagvlak voor het beheerplan.

#### *3.2 Monitoring- en Evaluatieprogramma (MEP Natuurcompensatie in de Voordelta)*

De uitvoering van de metingen is in 2009 goed verlopen. Een eerste jaarrapport met de resultaten is in de vorige verslagperiode opgesteld. Er zijn geen bijzonderheden te melden over de inhoud van dit jaarrapport 2009.

In het kader van het MEP Natuurcompensatie is een onderzoek gestart naar de effecten van kleinschalige garnalenvisserij op het bodemhabitat (zgn. garnalenexperiment) in het bodembeschermingsgebied. De doelen en de opzet van het onderzoek zijn in deze verslagperiode in gezamenlijkheid vastgesteld tussen de ministeries VenW en LNV, de visserijsector, natuurorganisaties en Havenbedrijf Rotterdam. Het onderzoek loopt tot en met 2013.

#### *3.3 Risico's*

De vraag op welke wijze regulering van de boomkorvisserij, buiten het bodembeschermingsgebied het beste geregeld kan worden, is nog onderwerp van studie. Het bevoegd gezag (min LNV) wil dit bezien in samenhang met de regulering van deze visserijvorm in de andere beschermde gebieden langs de Nederlandse kust. Er wordt gestreefd naar een oplossing in 2010. Mocht daarbij worden afgeweken van de huidige beleidslijn van het Beheerplan Voordelta (dit is: regulering via vergunning onder de Nb-wet), dan brengt dit risico's met zich mee. Een risico is ondermijning van het draagvlak voor het beheerplan, door de sector.



### 3.4 Planning

De planning is ongewijzigd sinds de opstelling van de basisrapportage PMR.

De activiteiten voor het Bodembeschermingsgebied met rustgebieden, Duincompensatie en monitoring en evaluatie verlopen conform onderstaand schema. Er zijn geen afwijkingen te melden tov de basisplanning.

Dit schema is met ingang van deze VGR opgeschoond, omdat veel activiteiten zijn afgerond, en de nadruk nu komt op monitoring en evaluatie, te beginnen met de mid term review van het Beheerplan Voordelta in 2011.

Planning PMR	2009	2010	2011	2012	2013	2021	2032
<b>Nbwet-vergunning</b>							
(voorbereiding en) procedure vergunning (incl inspraak)	afgerond						
beroepsprocedure/schorsingsverzoek/behandeling RvS	afgerond						
<b>Zeereservaat/Bodembeschermingsgebied</b>							
(voorbereiding en) procedure aanwijzingsbesluit Voordelta	afgerond						
beroepsprocedure en behandeling RvS A-besluit	afgerond						
(voorbereiding en) procedure beheerplan	afgerond						
beroepsprocedure en behandeling RvS BP		☆	uitspraak raad van state				
Ingesteld Bodembeschermingsgebied (zeereservaat)			Beheerfase				
<b>Duincompensatie</b>							
(voorbereiding) procedures duincompensatie	afgerond						
Aanleg/realisatie		afgerond					
<b>Monitoring en evaluatie</b>							
(voorbereiding) nulmetingen Duinen		☆			☆		
continue monitoring (Voordelta en Duinen)							
Mid term review			☆				
1e Evaluatie						☆	

Gerealiseerd  
 Nog te realiseren

Voor de duincompensatie geldt dat de aanlegwerkzaamheden gereed zijn, maar dat de natuurlijke ontwikkeling nog een groot aantal jaren nodig heeft voordat de uiteindelijke habitattypen gerealiseerd zijn. Totdat Maasvlakte2 in gebruik wordt genomen (naar huidige inzichten in 2013) kan de uitgangssituatie vastgesteld worden.

### 3.5 Scope/doelstellingen

Er zijn geen wijzigingen in de scope of de doelstellingen opgetreden.

### 3.6 Financiën

Voor de natuurcompensatie is een budget beschikbaar van € 112,5 mln (pp 2010; pp 2005: 99,3 mln). In de verslagperiode is geen beroep gedaan op de post Onvoorzien.

## Financieel overzicht natuurcompensatie

Bedragen in € mln

Omschrijving	Basis-rapportage 2005 pp 2005	Voortgangs-rapportage 7, december 2009, pp 2009	Uitgaven	Reeds gerealiseerde uitgaven	Ontvangsten *)
Bodembeschermingsgebied met rustgebieden, Zeereep en Duincompensatie	54,0			1,7	
Duincompensatie Delfland		52,8	54,6	48,0	1,2
Netto Stimuleringsprogramma Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden		10,1	12,1	9,0	2
Domeinrechten, Planschade en Nadeelcompensatie	24,0	8,5	9,7		1
Nulmeting, Monitoring en Evaluatie Programma (MEP)	13,0	28,4	28,9	5,4	0,0
Overig *)		7,1	7,2	0,8	0,0
<b>Subtotaal</b>	<b>91,0</b>	<b>106,9</b>	<b>112,5</b>	<b>64,9</b>	<b>4,2</b>
BTW (vanaf 2008 geïntegreerd)	9,0				
<b>Totaal</b>	<b>100,0</b>				

\*) Op het budget van het deelproject Natuurcompensatie heeft een technische mutatie plaats gehad: met name is in de begrotingsadministratie een bedrag van € 4,2 miljoen toegevoegd aan het uitgavenbudget voor een aantal in verband met de natuurcompensatie nog te realiseren ontvangsten (zie ook hoofdrapport).

In totaal is reeds een bedrag van € 78,2 mln aan verplichtingen aangegaan op het deelproject Natuurcompensatie, terwijl een bedrag van € 64,7 mln aan kasuitgaven is gerealiseerd.

Het totaal budget en de niveaus van de aangegane verplichtingen en van de gerealiseerde kasuitgaven zijn verwerkt in het hoofdrapport van de voortgangsrapportage, aangezien zij rijksuitgaven betreffen.

### 3.7 Organisatie/kwaliteit

Er zijn geen wijzigingen op dit onderdeel gedurende de verslagperiode.
