

Definitief locatieplan ondergrondse containers

1. Het locatieplan ondergrondse containers voor oud papier en karton (OPK) en glas vast te stellen.
2. Het eindverslag van de inspraak als bedoeld in de Inspraakverordening vast te stellen

Bent u het niet eens met het besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. U kunt uw beroepschrift indienen per post: Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is ook mogelijk om digitaal te procederen. Zie hiervoor <https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/>.

Bij een spoedeisend belang kunt u na of tegelijk met het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Definitief Locatieplan

Ondergrondse containers:
Oud Papier en Karton (OPK)
Glas

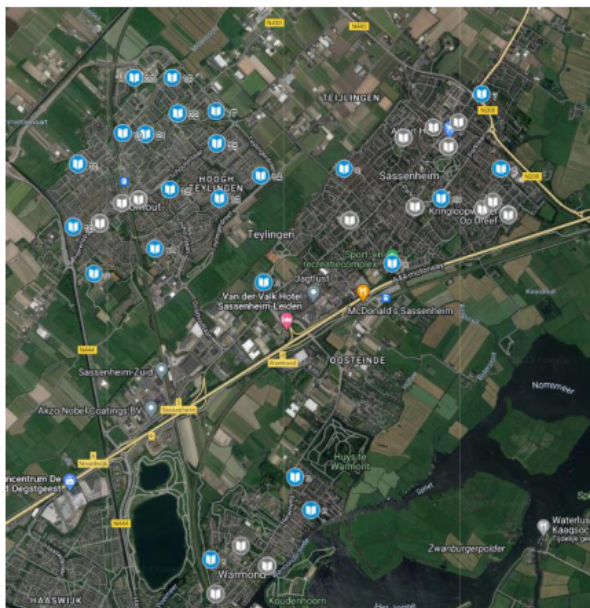
Gemeente Teylingen


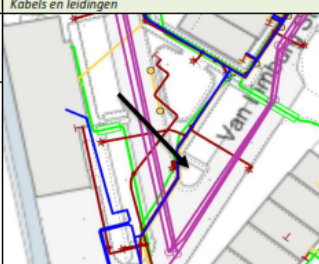
Legenda




Gas	
Electriciteit	
Data-transport	
Waterleidingen	
Riolering	



Legenda:



-  Bestaande papiercontainers
-  Nieuwe papiercontainers







Containernummer:	1	
Kern: Warmond	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Locatie: van Limburg Stirumstraat		
Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing in hoek van de bestrating, zoveel mogelijk richting de straat om voldoende afstand tot aanwezige leidingen te behouden.	Kabels en leidingen	Samenstelling afvalerland op locatie
Klik: Let op, voldoende afstand tot water- en gasleidingen behouden		NVT
Opmerkingen: Voor deze locatie wordt een alternatief onderzocht		

Containernummer:	2	
Kern: Warmond	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Locatie: Burgemeester Keterlaarstraat Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing in het trottoir naast parkeerstrook.		
Klic: Let op! Op locatie liggen veel kabels en leidingen. Check door middel van een proefsleuf is noodzakelijk.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Afweging om de huidige glascontainers wat op te schuiven richting parkeervak. Hiermee de minder kwalitatief goede betonput te vervangen en meer ruimte te krijgen voor de nieuwe papiercontainer. Daarbij meteen het straatwerk op locatie vernieuwen.		


Containernummer:	3	
Kern: Warmond	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Locatie: Marijkestraat Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing in de groenstrook, naast het trottoir. Hierbij 3 meter afstand houden van de boomkroon.		
Klic: Let op! Gasleiding nabij.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Voorafgaand aan plaatsing is het graven van een proefsleuf aan te raden. Ter afscherming wordt rond de containers een draadhek geplaatst.		



Containernummer:	4	
Kern: Sassenheim	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Locatie: Rodemolenweg		
Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing in de groenstrook aan de zijkant van de parkeerplaats. Betreft een opstelplaats voor huidige rolcontainers.		
Klic: Bij plaatsing in het groen rekening houden met de electra aansluiting van de lichtmast		
Opmerkingen:	Kabels en leidingen 	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie


Containernummer:	5	
Kern: Sassenheim	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Locatie: van Alkemadelaan / Sportdreef		
Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing van de container in het verbrede trottoir op de kop van de parkeervakken. Plaatsing hierbij zoveel mogelijk naar de wegkant.		
Klic: Geen belemmerende kabels en leiding in beeld.		
Opmerkingen: Op locatie wordt tevens een glascontainer (fase 1) bijgeplaatst. Deze wordt naast de beoogde papiercontainer geplaatst.	Kabels en leidingen 	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie 


Containernummer:	6	
Kern: Sassenheim	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Locatie: Geelhoornstraat Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing naast bestaande voorzieningen voor GFT en restafval. In lijn, in het groen direct aan het trottoir.		
Klic: Aandacht voor elektrakabel ter plaatse. Lijkt geen invloed te hebben op de plaatsingsmogelijkheden	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Zorgen voor voldoende afstand tot de bestaande voorzieningen op locatie.		

Containernummer:	7	
Kern: Sassenheim	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Locatie: Ter Leedelaan Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing naast bestaande voorziening voor GFT.		
Klic: Veel kabels en leidingen ter plaatse. Plaatsing is mogelijk, schuin achter bestaande voorziening.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Betreft noodzaak voor een proefsleuf om exacte ligging kabels en leidingen te bepalen. Mogelijk blijkt de locatie bij nader onderzoek niet mogelijk. In deze wijk zijn de mogelijkheden echter sterk beperkt.		




Containernummer:	8	OPK: 10/49
Kern: Sassenheim Korte locatieomschrijving: Locatie: Vooruitgangdreef / B.G.J. Berntzenlaan Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing in het trottoir aan de kop van de parkeerstrook.	Locatiefoto 	Plattegrond 
Klic: Geen belemmerende kabels en leidingen in beeld	Kabels en leidingen 	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie NVT
Opmerkingen: Voor deze locatie wordt een alternatief onderzocht		


Containernummer:	9	
Kern: Voorhout Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Sportlaan Betreft: Plaatsing naast het brede trottoir dat toegang geeft tot de school en de scouting. Hierbij gaat één parkeervak weg om ruimte te maken voor de containers.	Locatiefoto 	Plattegrond 
Klic: Op locatie ligt de gasleiding 3 meter van de straat af. Bij plaatsing zal het dus niet mogelijk blijken om de beide containers achter elkaar te plaatsen. Afweging om aan de overzijde te plaatsen Opmerkingen: Het reeds aanwezige brede trottoir dient bereikbaar te blijven voor de calamiteitendienst, waardoor plaatsing van de containers daar niet mogelijk is. Dit kan wel goed functioneren voor inwoners die grondstoffen aan willen bieden. Op locatie wordt ook een glascontainer (fase 1) geplaatst.	Kabels en leidingen 	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie NVT



Containernummer:	10	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving:		
Plaatsing fase 1		
Locatie: Dinsdagse Wetering		
Betreft: Plaatsing in het brede trottoir, naast de parkeerstrook. Let op vrije hoogte in verband met aanwezige boomkroon	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Klic: Let op! Ruimte is beperkt. Containerplaatsing lijkt mogelijk, mits direct aan de straat in lijn met parkeervak.		NVT
Opmerkingen: Deze locatie is niet ideaal in verband met kabels en leidingen en plaatsing in de woonwijk. Er zijn echter geen alternatieven in de nabijheid voorhanden. Met het oog op spreiding over wijken is deze locatie toch opgenomen in het locatieplan.		


Containernummer:	11	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving:		
Plaatsing fase 1		
Locatie: Boekenburglaan		
Betreft: Plaatsing in het laatste parkeervak. Parkeervak opheffen en gehele plek voorzien van verhoogd trottoir.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Klic: Let op! Afstand tot electra en riolering beperkt. Exacte plaatsing vergt proefsleuf voorafgaand aan de werkzaamheden		
Opmerkingen: Hier wordt tevens een Glascontainer geplaatst.		



Containernummer:	12	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Boterbloemstraat Betreft: Plaatsing in de kop van het parkeervak aan de overzijde van de bebouwing.		
Klic: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Proefsleuf graven voorafgaand aan de werkzaamheden		NVT

Containernummer:	13	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Kruidenschans / hoek Saffraanweg Betreft: Plaatsing in kleine groenstrook naast trottoir.		
Klic: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Vervallen		NVT



Containernummer:	14	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Snoeklaan tegenover huisnummer 114 Betreft: Plaatsing in een verhoogd trottoir tussen de parkeervakken op locatie.		
Klic: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Voor deze locatie wordt een alternatief onderzocht		NVT


Containernummer:	15	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Baarslaan t.h.v. nr. 2 Betreft: Plaatsing in het groen nabij de hoek van de straat.		
Klic: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen:		NVT




Containernummer:	16	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Bonekruidstraat bij school nr. 13 Betreft: <i>Plaatsing in het brede trottoir nabij de school. Deels in het groen, deel in het trottoir. Hierbij rekening houden met de boomkronen op locatie.</i>		
Klik: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Vervallen		NVT

Containernummer:	17	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Buxushaag Betreft: <i>Plaatsing in hoek van het trottoir naast parkeervakken naast bestaande voorzieningen GFT en restafval</i>		
Klik: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen:		NVT

Containernummer:	18	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Hyacint t.h.v. nr. 91 Betreft: Plaatsing in het brede trottoir op locatie, inwerpopening gericht naar het overige trottoir		
Klik: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Vervallen		NVT

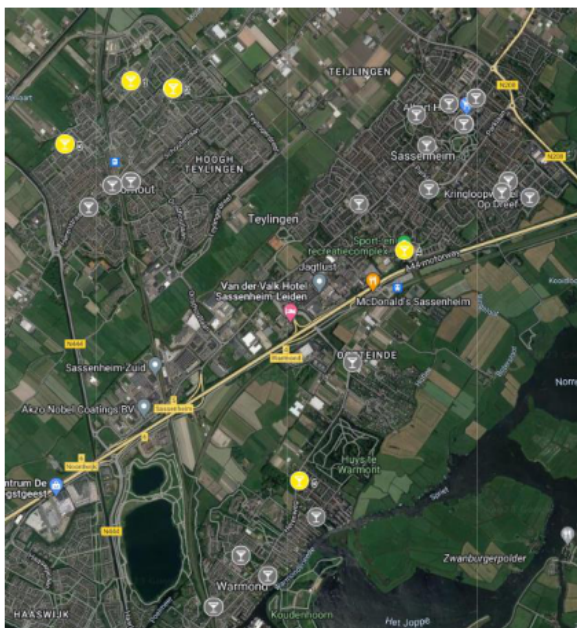
Containernummer:	19	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Compositenlaan t.h.v. nr. 229 Betreft: Plaatsing in een verbreed trottoir op locatie		
Klik: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen:		NVT

Containernummer:	20	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Keizerskroon Betreft: Plaatsing in de nieuwe woonwijk, op de hoek van de Ploenroos in het groen/trottoir.		
Klic: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Controle op locatie bij plaatsing, afronding nieuwe wijk.		NVT

Containernummer:	21	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Mozartlaan tegenover nr. 34 Betreft: Plaatsing naast bestaande containers voor restafval		
Klic: Mogelijk dient aanwezige datakabel wat verlegd te worden om de plaatsing mogelijk te maken.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Alternatief is om de papiercontainer aan de andere zijde van de aanwezige restafvalvoorzieningen te plaatsen. Daarvoor zal dan de lichtmast verplaatst moeten worden.		

Containernummer: 22		
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Jacoba van Beierenweg, naast sporthal "De Tulp" Betreft: Plaatsing in het trottoir tussen de bomen op locatie		
Klic: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Op locatie wordt ook voorzien in de plaatsing van twee glascontainers (fase 1).		

Containernummer: 23		
Wijk: Sassenheim	Straat: Parkhove	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsen van een ondergrondse OPK container. Dit betreft plaatsing van een container op grond van VvE Parkhove.	Bedoeld voor: — Parkhove 101 t/m 807 (52) Aantal aansluitingen: 52 Maximale loopafstand: 50 meter	
Klic: Let op: vrij verval leidingen in de buurt verlegging hiervan noodzakelijk!	Kabels en leidingen	Locatiefoto
Opmerkingen: Inrit via Menneweg		




Legenda:



- Bestaande Glascontainers
- Nieuwe Glascontainers

Containernummer:	1	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Strausspark Betreft: Plaatsing in het verbrede trottoir, gelegen tussen de aanwezige parkeerplaatsen op locatie		
Klic: Klic melding nog niet beschikbaar	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen:		NVT

Containernummer:	2 + 3	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Jacoba van Beierenweg, naast sporthal "De Tulp" Betreft: Plaatsing in het trottoir tussen de bomen op locatie		
Klik: Geen belemmerende kabels en leidingen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Op locatie wordt ook een papiercontainer geplaatst.		

Containernummer:	4	
Kern: Sassenheim	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving: Locatie: van Alkemadelaan / Sportdreef Plaatsing fase 1 Betreft: Plaatsing van de container in het verbrede trottoir op de kop van de parkeervakken. Plaatsing hierbij zoveel mogelijk naar de wegwand.		
Klik: Geen belemmerende kabels en leiding in beeld.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: Op locatie wordt tevens een papiercontainer geplaatst.		

Containernummer:	5	
Kern: Voorhout	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving:		
Plaatsing fase 1		
Locatie: Boekenburglaan		
Betreft: Plaatsing in het laatste parkeervak. Parkeervak opheffen en gehele plek voorzien van verhoogd trottoir.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Klic: Let op! Afstand tot electra en riolering beperkt. Exacte plaatsing vergt proefsleuf voorafgaand aan de werkzaamheden		
Opmerkingen: Hier wordt tevens een papiercontainer geplaatst.		

Containernummer:	6	
Kern: Warmond	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving:		
Plaatsing fase 1		
Locatie: Marijkestraat		
Betreft: Plaatsing in de groenstrook, naast het trottoir. Hierbij voldoende afstand houden van de boomkroon.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Klic: Let op! Gasleiding nabij.		
Opmerkingen: Voorafgaand aan plaatsing is het graven van een proefsleuf aan te raden.		

Containernummer:	1	
Kern: Sassenheim	Locatiefoto	Plattegrond
Korte locatieomschrijving:		
Locatie: Papendrechtlaan 14		
Betreft: Plaatsing van een 1.500 liter exemplaar voor de fractie van restafval. Plaatsing tegen heg aan, met voldoende afstand tot de aanwezige boomkroon.	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Klic: Geen belemmerende kabels en leidingen		NVT
Opmerkingen:		
