

6e Rapportage
Comité van Toezicht
Investeringsbudget Landelijk Gebied

Datum: 4 Januari 2013

Voorwoord

De onderhandelingen over het Natuurakkoord tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk hebben op 23 November 2012 geleid tot nieuwe bestuursovereenkomsten gericht op de afwikkeling van het ILG. De afspraken zijn er op gericht om tot afwikkeling van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) te komen over de periode 2007 tot en met 2010. Deze periode zal worden afgesloten met een beoordeling van de bereikte prestaties door het Comité en een afsluitende accountantscontrole van de bestedingen ten laste van de rijksbijdrage.

Deze 6^e rapportage heeft tot doel inzicht te geven in de gerapporteerde prestaties en bestedingen tot en met het jaar 2011. De aanleiding hiervan is de wens van de Tweede Kamer om nader inzicht in de voortgang van het ILG en van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als onderdeel daarvan in verband met vaststelling van de rekening van het voormalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het jaar 2011, waarin de verleende voorschotten over dat jaar voor het ILG zijn verantwoord.

Voormalig staatssecretaris Bleker heeft in Augustus 2012 het Comité verzocht de prestatiebeoordeling voor 1 maart 2013 af te ronden. Het Comité heeft daarmee ingestemd onder vermelding dat deze doelstelling afhankelijk is van de medewerking en de mogelijkheden van de provincies om de benodigde informatie tijdig beschikbaar te stellen. Inmiddels is gebleken dat deze termijn te ambitieus is geweest, mede in verband met de voorbereiding van de nieuwe bestuursovereenkomsten. Het Comité streeft er nu naar de beoordelingswerkzaamheden in het eerste halfjaar van 2013 af te ronden met een eindrapportage.

W. Veldman (voorzitter)

W. van den Arend

H. Mulder

W. Wijntjes

I. Oomes (secretaris)

Inhoud

1. Inleiding.....	4
2. Opvattingen CvT ILG over de prestatie- en bestedingsinformatie tot en met 2011	5
3. De resultaten van het ILG.....	10
4. De normkostenproblematiek.....	12
5. De prestaties en bestedingen tot en met 2011.....	14
5.1 Algemeen ILG.....	14
5.2 Prestaties Natuur.....	15
5.2.1 Ecologische hoofdstructuur EHS.....	15
5.2.2 Natuur buiten de EHS	19
5.3 Landbouw	20
5.4 Recreatie.....	21
5.5 Landschap	25
5.6 Bodem.....	27
5.7 Water.....	27
5.8 Aandachtsgebieden	28
5.9 Vitaliteit	28
5.10 Samenvatting beheer.....	29
6. Betekenis van de uitgevoerde accountantscontrole voor de vaststelling van prestaties en bestedingen	30
7. Werkwijze CvT ILG in verband met de prestatievaststelling.....	31
Annex 1 Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie tot en met 2011.....	32
Totaaloverzicht	33
Groningen	34
Friesland.....	35
Drenthe.....	36
Overijssel.....	37
Gelderland.....	38
Utrecht.....	39
Zuid Holland.....	40
Noord Holland	41
Limburg.....	42
Noord Brabant.....	43
Zeeland	44
Flevoland	45

1. Inleiding

Op 12 oktober j.l heeft het Comité zijn 5^e rapportage uitgebracht met daarin een risicoanalyse van de huidige situatie van het ILG mede in het licht van het onderhandelingsakkoord (natuurakkoord) tussen het IPO en het Rijk.

Het CvT ILG is inmiddels begonnen met de beoordeling van de prestaties van de afzonderlijke provincies over de periode 2007 tot en met 2010. Over de uitkomsten van dit onderzoek zal pas worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke bewindspersoon nadat een volledige hoor- en wederhoor procedure is afgewerkt met de betreffende colleges van Gedeputeerde Staten.

De nu voorliggende 6^e rapportage van het CvT ILG is opgesteld in verband met de afwikkeling van de motie Jacobi c.s. voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juli 2012¹. Aan het Comité is gevraagd een kritische beoordeling te geven over de informatie die aan de Tweede Kamer in dat verband is verstrekt. Deze informatie heeft betrekking op prestatie- en bestedingsinformatie van EHS en overig ILG over het jaar 2011, de uitkomsten van een door Alterra uitgevoerd onderzoek naar de effectiviteit van het ILG tot dusverre en over de voorstellen voor oplossing van de zogenaamde normkosten problematiek.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de door provincies verstrekte prestatie- en bestedingsgegevens over 2011 mede in verband met de motie Jacobi.

Het commentaar van het CvT op het door Alterra uitgevoerde onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 3. De opmerkingen bij de uitkomsten van het normkostenonderzoek worden behandeld in de hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat een globale beoordeling van de door provincies verstrekte prestatie en bestedingsgegevens over de periode 2007 tot en met 2011. In Annex 1 zijn de overzichten van het ILG zowel in totaal als per provincie over de periode 2007 - 2011 opgenomen².

Hoofdstuk 6 gaat over de door provincieaccountants en de accountants van het ministerie van EL&I (sinds mei 2012 Audit Dienst Rijk) uitgevoerde controles en de afgegeven controleverklaringen voor de beoordeling van prestaties en van de gerapporteerde bestedingen ten laste van de rijksbijdragen.

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de voorgenomen werkwijze van het CvT ILG voor de vaststelling van de provinciale prestaties per operationeel doel van het ILG.

¹ Kamerstuk 33 240 nr. 17

² In de 4^e rapportage van het CvT ILG zijn de overeenkomstige gegevens opgenomen over de periode 2007 tot en met 2010.

2. Opvattingen CvT ILG over de prestatie- en bestedingsinformatie tot en met 2011

In de motie Jacobi is gevraagd in November 2012 een volledige en adequate rapportage op te stellen van het ILG over de periode 2007 tot en met 2011 en inzicht te geven in de verplichtingenstand. De rapportage zou een analyse moeten bevatten van de gerealiseerde ILG prestaties en bestedingen en inzicht moeten geven in de betekenis van de investering voor de beoogde natuurdoelen. Tevens zou inzicht moeten worden gegeven in de verscheidenheid in grondprijzen.

Beschikbare informatie over prestaties en bestedingen

In Annex 1. bij deze rapportage is een overzicht opgenomen van prestaties en bestedingen zowel in totaal als per provincie over de periode 2007 tot en met 2011, uitgesplitst per operationeel doel. Dit betreft de informatie uit de voortgangsrapportages van de provincies tot en met 2010, aangevuld met de aan het Comité verstrekte gegevens over 2011.

Bij de opgave door de provincies van de bestedingsgegevens over 2011 is in afwijking van voorgaande jaren geen gebruik gemaakt van gewaarmerkte overzichten, omdat de controleverklaringen van de provinciale accountants over 2011 niet beschikbaar zijn gesteld. Deze afwijking in procedure voor 2011 is een gevolg van de gemaakte afspraken in het Natuurakkoord.

Het Comité is van mening dat de overzichten in Annex 1 bij dit rapport betekenisvolle informatie geven. Er wordt een globaal beeld zichtbaar zowel voor het hele land als voor de afzonderlijke provincies. In zijn eerdere rapportages heeft het Comité herhaaldelijk aangegeven dat de verstrekte informatie in de jaarlijkse voortgangsrapportages (het zogenaamde PEIL) belangrijke tekortkomingen heeft. Voor een oriëntatie op beleidsdoeleinden kan deze informatie van nut zijn, echter zonder nader onderzoek acht het Comité het niet verantwoord op deze basis tot afrekening en afwikkeling te komen.

De nu bekende tekortkomingen in de overzichten, zoals opgenomen in Annex 1 kunnen als volgt worden toegelicht.

De prestaties voor verwerving (Ecologische Hoofdstructuur en Recreatie om de Stad) zijn gebaseerd op achtereenvolgende metingen per 1 januari 2007 en per 1 januari 2011. De in deze zogenaamde nulmetingen op kaart (NOK) opgenomen waarden betreffen zowel feitelijke aankopen als meetverschillen en mogelijk andere correcties.

Meer algemeen wordt opgemerkt dat de informatie uit de natuurmetingen op kaart (NOK) niet als verantwoordingsinformatie kan worden opgevat. Doel van het NOK is de gebiedsontwikkeling middels kaartgegevens zichtbaar te maken. Daarbij is het niet noodzakelijk dat de kaartgegevens aansluiten op de onderliggende registraties. Deze verschillen, de oorzaken en de betekenis daarvan zullen door het CvT ILG nader worden onderzocht en na afronding van het onderzoek bij de provincies worden gerapporteerd. Zoals hiervoor vermeld is het CvT ILG van mening dat de NOK gegevens relevant zijn voor de verdere beleidsvorming. De aansluiting op de onderliggende registraties zal te zijner tijd worden gebruikt voor de afwikkeling van de rijksbijdrage.

Het Comité gaat er van uit dat de opgegeven financiële bestedingen zijn gebaseerd op werkelijke uitgaven voor de verwerving van natuur- en recreatiegronden. Het Comité beschikt voor elke provincie over alle uitgevoerde grondtransacties via het Bureau Beheer landbouwgronden (BBL) over de periode 2007 tot en met 2011. De transacties die niet via BBL zijn verlopen (beperkt in aantal) zullen nog door de provincies aan het Comité ter beschikking worden gesteld. In de rapportages per provincie zal worden aangegeven wat de feitelijke verwerving is geweest en welke bestedingen daar bij behoren. Tevens zal kunnen worden aangegeven wat in de 'oude' systematiek van het ILG nog de resterende taakstelling inzake grondverwerving is van een provincie per 1 januari 2011 en per 1 januari 2012.

De prestaties voor inrichting (EHS, Landbouw, Recreatie, Landschap), zoals vermeld in de voortgangsrapportages zijn niet eenvoudig vast te stellen. In het kader van het onderzoek bij de provincies zal duidelijk moeten worden welke betekenis kan worden gehecht aan de voor inrichting in de voortgangsrapportages vermelde hectaregegevens, omdat deze per project zijn vastgesteld en niet kan worden teruggevallen op één gegevensbron. Het Comité heeft de beschikking over de bestedingen, voor zover deze zijn gedaan door de Dienst landelijk Gebied (DLG) over de periode 2007 tot en met 2011. Deze informatie laat zien voor welke (deel) fase en afzonderlijk project in een gebiedsontwikkeling gelden zijn toegezegd, jaarlijks zijn besteed in 2007 tot en met 2011 en welke geldelijke ontvangsten er zijn geweest. Ook is daarin direct afleesbaar in hoeverre bestedingen betrekking hebben op door het rijk per 1 januari 2007 aan de provincies overgedragen lopende verplichtingen (oude toezeggingen) en de daarna door provincie toegezegde bedragen voor gebiedsontwikkeling. Deze informatie sluit echter nog niet aan bij de voortgangsrapportages van de provincies.

De vraag in de motie Jacobi naar de verplichtingenstand is in deze fase in zoverre te beantwoorden dat een maximumstand kan worden vastgesteld. Deze stand is het verschil tussen de bij beschikkingen toegezegde (oude en nieuwe) middelen voor afzonderlijke projecten, verminderd met de betaalde bedragen en vermeerderd met ontvangsten. Vele projecten zijn echter geëindigd of worden niet voortgezet zonder dat de niet meer noodzakelijke middelen zijn vrijgemaakt. Het Comité zal bij het onderzoek van de prestaties aan de provincies vragen voldoende inzicht te geven en na onderzoek hierover rapporteren.

Met betrekking tot beheer verwacht het Comité dat de in de voortgangsrapportages opgegeven prestaties en bestedingen voldoende betrouwbaar zullen blijken, mede gezien de strikte controle-eisen rond de uitvoering van beheersregelingen. De Dienst regelingen (DR) heeft aan het Comité nauwkeurige informatie verschaft over de periode 2007 tot en met 2011, waaruit landelijk en per provincie de verleende en uitbetaalde subsidies per beheersregeling zijn af te lezen.

Voor de overige ILG doelen kunnen dezelfde opmerkingen worden gemaakt als hiervoor opgenomen voor inrichting.

Samenvattend is het CvT van oordeel dat de in Annex 1 opgenomen gegevens in deze fase van afwikkeling het best beschikbare kwantitatieve beeld geven van de inzet van de rijksbijdrage in het ILG.

Aan de provincies verleende voorschotten ILG en uitputting van het Groenfonds

De provinciale rekeningen van het Groenfonds kunnen worden beschouwd als normale bankrekeningen, echter uitsluitend bedoeld voor de financiering van ILG bestedingen.

Uit de jaarverslagen van het Groenfonds over de periode 2007 tot en met 2011 zijn de volgende gegevens in verband met de storting en opnames van de rijksbijdrage af te leiden voor alle provincies gezamenlijk.

Totaal	Saldo	Voorschot	Opnamen	Stortingen	Rente	Totaal
Jaar	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000		x € 1.000	x € 1.000
2007	0	439.201	-263.685	10.720	9.344	195.580
2008	195.580	498.177	-421.477	1.714	11.992	285.985
2009	285.985	427.940	-470.349	0	6.400	249.976
2010	249.976	472.264	-483.274	0	1.572	240.538
T/m 2010		1.837.582	-1.638.785	12.434	29.308	
2011	240.538	643.574	-485.204		2.800	401.708
T/m 2011		2.481.156	-2.123.989	12.434	32.108	

Hieruit kan worden afgeleid dat tot en met 2011 € 2,48 miljard is gestort en dat de provincies 2,12 miljard hebben opgenomen. Rekening houdend met stortingen door provincies en ontvangen rente staat per 1 januari 2012 nog € 401 miljoen als niet opgenomen. Dit overzicht geeft aan dat in 2011 het hoogste voorschot is uitbetaald over de gehele ILG periode (conform afgesproken kasritme), dat tevens de hoogste opname door provincies is geweest en dat het openstaande saldo nog niet zo hoog is geweest.

Afwikkeling rijksbijdrage

In het kader van de afrekening van de rijksbijdrage tussen rijk en provincies zal per provincie een vaststelling moeten worden gemaakt van het verschil tussen ontvangen voorschotten en de vast te stellen rijksbijdrage. Op basis van de voorschotverrekening en de gebruiksregels van het Groenfonds zullen te zijner tijd deze rekeningen moeten worden vereffend.

Op 23 november 2012 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken met de afzonderlijke colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies een overeenkomst gesloten gericht op het per 14 december 2011 laten vervallen van de bestuursovereenkomsten ILG 2007 – 2013. De afrondingsovereenkomsten regelen dat de provincies aanspraak maken op een budget dat conform het Natuurakkoord wordt bepaald op basis van de in de periode van 1 januari 2007 tot en 1 januari 2011 door de provincie daadwerkelijk geleverde prestaties tegen een reëel normkostenniveau. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke bestedingen door de provincie van de middelen van het oorspronkelijk verleende investeringsbudget tot 1 januari 2011 ten behoeve van de in de bestuursovereenkomst ILG 2007–2013 overeengekomen doelen en prestaties, op basis van gewaarmerkte accountantscontroles en een beoordeling van de prestaties door het Comité van Toezicht.

Verder is in de afrondingsovereenkomsten vastgelegd is dat een definitieve afwikkeling van de rijksbijdrage pas kan plaatsvinden als de WILG in overeenstemming met het Akkoord is gewijzigd

en dat de voorgenomen afwikkeling, inclusief FES- projecten en de verstrekte voorschotten, dient plaats te vinden met inachtneming van de WILG zoals deze thans luidt.

De afrondingsovereenkomsten geven de volgende uitgangspunten voor de afwikkeling van het ILG tot en met 2010:

- het door een accountant gewaarmerkte PEIL- overzicht 2010;
- verklaring met betrekking tot de jaren 2007 tot en met 2010 van de Dienst Regelingen over de bestedingen van de provincies ten laste van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);
- verklaring van de Stichting Groenfonds over de bestedingen van de provincie ten laste van de leenfaciliteit en ten laste van de garantieregeling voor grondverwerving;
- verklaring van het Bureau Beheer Landbouwgronden over de inzet ten behoeve van de middelen voortkomend uit de exploitatiewinst als gevolg van grondtransacties.

De 12 nieuwe overeenkomsten vervangen de bestuursovereenkomsten ILG 2007 -2013, gesloten op 18 December 2006 en laatstelijk gewijzigd op 16 December 2010.

Voor alle provincies is een aanspraak (op de rijksbijdrage) vastgesteld voor de perioden:

- a. 1 januari 2007 tot en met 31 December 2010;
- b. 1 januari 2011 tot en met 31 December 2013.

De aanspraak sub a. is bedoeld als afrekening van de gerealiseerde bestedingen tot en met 2010, overeenkomstig het Akkoord. Het tweede deel sub b. dient ter financiering van het beheer en van de harde juridische verplichtingen die zijn aangegaan voor 20 Oktober 2010 met het oog op de in het Akkoord genoemde doelstellingen. De verdeling van de aanspraken is gebaseerd op een door de provincies gezamenlijk bepaalde onderlinge verdeling. De middelen over 2011 tot en met 2013 worden verstrekt als specifieke uitkering of als decentralisatie-uitkering op basis van de Financiële verhoudingswet. De verdeling tussen de provincies kan tot uiterlijk op 15 april 2013 worden gewijzigd indien de kosten van beheer over de periode 2010 tot en met 2013 daartoe aanleiding geven.

De financiële afwikkeling van de aanspraak gebeurt onder aftrek van verleende voorschotten. Daarbij wordt er van uitgegaan dat het rijk de in de ILG beschikking vermelde afdrachten aan het BTW - compensatiefonds heeft afgewikkeld (dit houdt in dat er van wordt uitgegaan dat de PEIL bestedingen voor zover van toepassing eveneens exclusief BTW zijn gerapporteerd).

De afspraken over de beschikbaarstelling van de capaciteit van de Dienst Regelingen (DR) en de Dienst Landelijk gebied (DLG) zijn beperkt tot en met het jaar 2014.

De overeenkomsten bevatten een afspraak over de rechtmatigheidstoets van besteding van middelen. Daarin wordt aangesloten op artikel 10 tweede lid, onderdeel a en d van de huidige WILG, waarin is opgenomen dat middelen dienen te worden besteed aan de vermelde doelen in de beschikking. Bestedingen die niet aan deze eis voldoen zullen bij de betreffende provincie worden gecorrigeerd en komen volgens de door de provincies gezamenlijk bepaalde verdeelsleutel ten goede aan alle provincies.

Met betrekking tot de status van de beoordeling door het Comité van Toezicht is in de afrondingsovereenkomsten vastgesteld dat deze is gebaseerd op hoofdstuk 4a van de Regeling

inrichting landelijk gebied. Conform het Akkoord zal het CvT de prestaties per provincie beoordelen die door de provincies zijn geleverd voor het overeengekomen bedrag van € 2.014.194.000 aan bestedingen over de periode 2007 – 2010. In de afrondingsovereenkomsten wordt als meerwaarde gezien dat deze beoordeling zicht biedt op de tot nu toe geleverde prestaties door de provincies en dat zij de verschillen verklaart tussen de ILG-cijfers, gebaseerd op de gewaarmerkte PEIL-rapportages en de cijfers van de provincies die vaak gebaseerd zijn op meer bronnen. Aangegeven is dat de rapportage en de bevindingen van het CvT geen deel uitmaken van de overeenkomst en de uitkomsten van de prestatiebeoordeling daarmee geen invloed kunnen hebben op het totaal aan beschikbare middelen voor de afronding van het ILG.

Voor de prestatiebeoordeling door het CvT is het in verband met de daarmee samenhangende bestedingen van belang dat beschikt kan worden over de uitkomsten van de accountantscontroles per provincie over de periode 2007 tot en met 2010. In hoofdstuk 6 van dit rapport wordt nader ingegaan op de betekenis van de accountantscontrole, zowel voor de prestatiebeoordeling als voor de afwikkeling van de rijksbijdrage in het ILG.

Het Comité is van mening dat op dit moment onvoldoende basis aanwezig is voor het gewenste inzicht in de aanwending van de ILG gelden tot en met 2011. Volledige duidelijkheid is pas mogelijk na uitvoering van de prestatiebeoordeling door het Comité en de (nog) uit te voeren werkzaamheden in het kader van de accountantscontrole.

3. De resultaten van het ILG

Op verzoek van het ministerie van EL&I is door Alterra onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bereikte resultaten van het ILG en het opsporen van 'lessons learned'.

Het CvT heeft kennisgenomen van de uitkomsten van dit onderzoek³. De rapportage geeft naar de mening van het CvT een goed inzicht in de ontwikkeling van het ILG als geheel. Het Comité heeft er begrip voor dat in de korte periode waarin de onderzoekers hun onderzoek hebben uitgevoerd zij zich grotendeels hebben moeten beperken tot hoofdlijnen en meer algemene ontwikkelingen. De ontwikkelingen in de ILG (natuur- en andere) doelen hebben naar de mening van het CvT door omvang en veelsoortigheid tot dusverre te weinig individuele aandacht gehad. Het is daarom plezierig dat in deze rapportage een aantal concrete ontwikkelingen zijn neergezet.

Het ILG en de in dat verband afgesloten bestuursovereenkomsten betreffen twee partijen die gezamenlijk doelen hebben gesteld. De uitgangspunten in de huidige Wet Inrichting landelijk Gebied (WILG) zijn dat de provincies het ILG uitvoeren en dat het rijk op afgesproken punten belangrijke condities invult. Bij de start van het ILG in 2007 is mogelijk onderschat dat zeker een aantal provincies een lange aanloop nodig hebben gehad, omdat geen of weinig ervaring bestond met de sturing van de uitvoering. Nagenoeg alle provincies hebben op dit punt een flinke omslag moeten maken en dat heeft een flitsende start van het ILG in de weg gezeten. Het rijk heeft zich vanaf het najaar 2010 meer geconcentreerd op de realisatie van de bezuiniging op het ILG.

Bij de aanvang van het ILG was de verwachting dat het rijk ca 2/3 van de middelen zou verstrekken en dat de provincies zich zullen inspannen om ook een derde deel bij te dragen met eigen middelen en met andere partijen. Hierin zijn de provincies, mede gezien de beperkte periode, nog niet zichtbaar geslaagd.

De gedachte achter de bestuursovereenkomsten is geweest dat overheden elkaar moeten kunnen aanspreken op prestaties. Tot eind 2010 is naar dit principe gehandeld en zijn via de zogenaamde PEIL-formats relevante beleidsprestaties gerapporteerd. In het kader van de Mid Term Review in de zomer van 2010 is daarnaast belangrijke beleidsinhoudelijke informatie ook op gebiedsniveau door de provincies verstrekt. Het CvT is daarom van mening dat wel degelijk beleidsprestaties zijn bijgehouden en de feitelijke gebiedsontwikkelingen fysiek kunnen worden aanschouwd.

Een belangrijk punt in de gebiedsgerichte ontwikkeling is het kunnen beschikken over relevante en voldoende betrouwbare informatie. Het CvT ILG heeft in voorgaande rapportages gepleit voor de instelling van een gegevensautoriteit. De huidige informatievoorziening voor beleidsdoeleinden is gebaseerd op kaartmateriaal, omdat alleen daarmee beeldvorming mogelijk over een gebiedsontwikkeling. Gebleken is echter dat de aansluiting tussen NOK, de facto alleen kaartgegevens, en formele registraties van grond en bestemming, problematisch is gebleken. Bij de voorliggende rapportages wordt dit zichtbaar doordat de gegevens uit de Nulmeting op kaart en de door de provincies in het kader van het ILG opgegeven prestaties (PEIL) niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Het CvT heeft in deze fase van onderzoek wel kunnen

³ Alterra Wageningen UR, rapport nummer 2371 2012

vaststellen dat de PEIL gegevens in belangrijke mate herleidbaar zijn op onderliggende registraties in het bijzonder van DLG en DR.

4. De normkostenproblematiek

Het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en Alterra (Universiteit Wageningen) heeft een onderzoek gedaan naar methoden, kosten en prestaties in het ILG-kader voor verwerving en inrichting van EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en RodS (Recreatie om de Stad). Daaruit komt naar voren dat de DLG administraties een goede bron van informatie bieden over de periode 2007 tot en met 2010.

Verwerving EHS en RodS

Over de gerealiseerde grondprijzen is gesteld dat deze gemiddeld vrijwel marktconform zijn geweest.

Alterra heeft een analyse uitgevoerd per provincie op de aankoop van akkerbouw- en grasland waaruit blijkt dat afwijkingen sterk regionaal gebonden zijn. In totaal is ca. 11.229 hectare voor de EHS in beschouwing betrokken. In totaal is echter ruim 19.000 hectare EHS verworven (inclusief ruilgronden en natuurterreinen).

De door Alterra onderzochte aankopen zijn door DLG (Dienst Landelijk Gebied) gerealiseerd in opdracht van de provincies waarbij vaste procedures zijn gevolgd. Het CvT merkt op dat het onderzoek geen betrekking heeft gehad op de verkopen van gronden door DLG in opdracht van de provincies en de door provincies buiten DLG om aangekochte en verkochte gronden. Ook is geen nader onderzoek gedaan naar de verworven gronden anders dan akkerbouw- en grasland. Deze aankopen, de verkopen en de aan- en verkopen van gronden buiten DLG om zullen in een later stadium door het CvT ILG worden beoordeeld.

Zoals de onderzoekers melden, is het onderzoek in relatief korte tijd uitgevoerd. Dit korte tijdsbestek heeft invloed gehad op de gekozen informatiebronnen en op de onderzoeksmethode.

Het CvT heeft ook een analyse gemaakt van de (gewogen) gemiddelde aankooprijzen per gebied, in totaal en per jaar voor iedere provincie. De bron, die wij hebben gebruikt, zijn de aankopen 2007 tot en met 2010, die bij DLG/BBL zijn vastgelegd. Bij onze analyse zijn alle aankopen betrokken, ook eventuele aankopen van grond met bijbehorende opstallen. De (gewogen) gemiddelde aankooprijzen zijn vergeleken met de normprijzen zoals aangegeven in de Bestuursovereenkomsten van December 2007 en met de prijzen in de jaarlijkse grondmonitor per provincie. Uit onze analyse blijken afwijkingen ten opzichte van de normprijzen en ten opzichte van de grondmonitor (marktconforme) prijzen waarbij dit per provincie en per jaar sterk van elkaar verschilt. Het CvT zal hier verder nog nader onderzoek naar doen.

De relatie tussen de gerapporteerde hectares en bestedingen is in de voortgangsrapportages niet altijd direct te leggen. Prestaties zijn zowel met besteding van rijksgeld als met provinciale en andere gelden gerealiseerd.

Inrichting EHS en RodS

Met betrekking tot de inrichting EHS is door Alterra onderzoek gedaan naar de na 1 januari 2007 (begin ILG) gestarte projecten, die intussen zijn gereedgekomen. Daarbij gaat het om 1.917 hectare (van in totaal ca. 18.930 hectare volgens de voortgangsrapportages over de periode 2007 tot en met 2011). Het merendeel van de gebiedsinrichting heeft, zoals ook Alterra vermeld, betrekking op projecten die voor en na 1 januari 2007 zijn gestart maar nog niet zijn afgerond.

Over de onderzochte projecten is gemeld dat deze gemiddeld ten opzichte van de in de bestuursovereenkomsten afgesproken normkosten ca. twee maal zo hoog zijn geweest.

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het niet mogelijk is te komen tot reële normkosten, zoals in het natuurakkoord is afgesproken.

Het CvT merkt op dat het merendeel van de inrichtingsprojecten is gestart voor 1 januari 2007 en nog onderhanden zijn of zijn afgerond in de ILG periode. Deze zijn dus niet meegenomen in het onderzoek van Alterra. Voor de inrichtingsprojecten is het lastig om tot reële normkosten te komen, aangezien de hectares niet zijn vastgelegd in hetzelfde systeem waar de uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op het ILG zijn geadministreerd. De hectares zijn op kaartmateriaal wellicht beschikbaar, maar het is niet altijd duidelijk welke hectares met ILG middelen zijn gefinancierd.

Samenvattend

Het kwantitatieve onderzoek van LEI/Alterra geeft noch voor verwerving noch voor inrichting voldoende houvast om de oorspronkelijk in de Bestuursovereenkomsten afgesproken normkosten te vervangen door reële normkosten. Voor een belangrijk aantal onderdelen (verwerving en beheer) zullen veelal de ten behoeve van de ILG doelen gerealiseerde hectares een basis kunnen vormen. Voor deze onderdelen zijn zowel de oorspronkelijke normkosten als de werkelijke uitgaven beschikbaar.

Voor een aantal andere onderdelen waaronder inrichting zal de kwantitatieve prestatie minder goed of niet zijn vast te stellen. In die gevallen zal nader worden onderzocht of de opgegeven bestedingen betrekking hebben op ILG doelen en projecten.


5. De prestaties en bestedingen tot en met 2011

5.1 Algemeen ILG

Het ILG kader is vastgelegd in de zogenaamde overzichtconstructie ILG⁴. Daarin zijn vanaf 2007 begrotingsbedragen samengevoegd van verschillende beleidsartikelen van meerdere ministeries. Het ILG kader vormt de basis voor de aan de afzonderlijke provincies afgegeven beschikkingen ILG en de bevoorschotting aan de provincies.

ILG kader	X € 1.000
Totaal rijksinzet	4.151.419
PNB, BBL, POP ⁵	-432.699
Totaalbestuursovereenkomsten	3.718.720
Diverse bekende verschillen	- 24.208
Bruto rijksbijdrage volgens beschikking	3.694.512
Btw compensatie fonds ⁶	117.401
Netto rijksbijdrage volgens beschikking	3.577.111

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de door provincies gezamenlijk gerapporteerde cumulatieve bestedingen (exclusief PNB en POP) per jaar over de periode 2007 tot en met 2011 ten opzichte van het beschikbare budget, alsmede de cumulatieve via het Groenfonds uitbetaalde voorschotten.

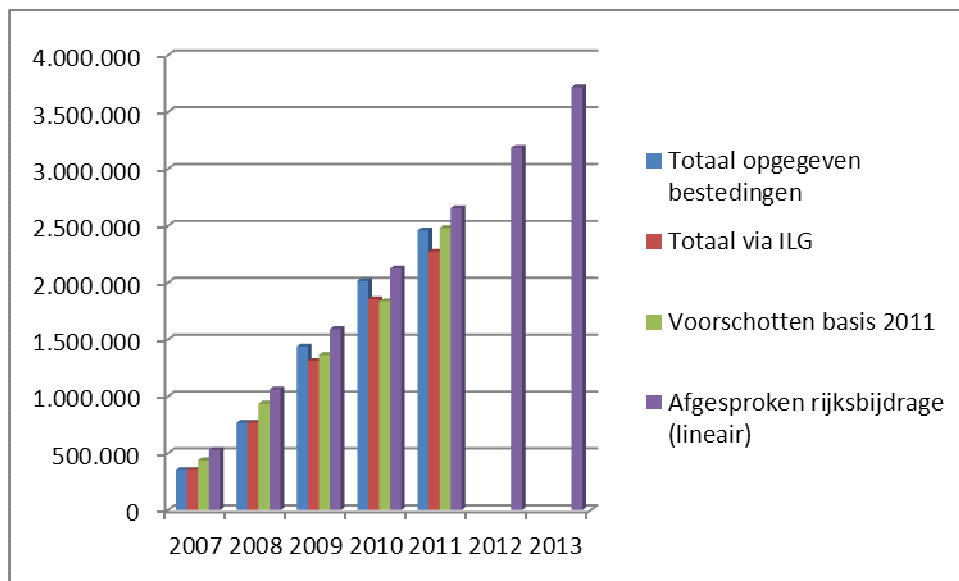

Grafiek 5.1

Het verschil tussen de 'totaal opgegeven bestedingen' en 'totaal ILG' betreft de uitgaven in het kader van de PNB regeling'.

⁴ Zie kamerstuk 33240 XII 19, dd 29 juni 2012

⁵ PNB zijn leningen en garantiestellingen Particulier Natuurbeheer, die buiten het ILG zijn gefinancierd. BBL betreft het aandeel ten behoeve van het ILG in de exploitatieresultaten van het Bureau Beheer Landbouwgronden. POP betreft de bijdragen uit het Europees Landbouwfonds Fonds voor Plattelandsontwikkeling (EFLPO).

⁶ Betreft de afdracht van het ministerie aan het BTW-Compensatiefonds; de provincies kunnen omzetbelasting in hun bestedingen terugvragen bij het Fonds.

De voorschotten tot en met 2011 zijn daadwerkelijk uitbetaald. Geconstateerd kan worden dat het uitgavenpatroon niet zichtbaar heeft geleden onder de voorgenomen bezuiniging.

In de volgende paragrafen worden de prestaties en bestedingen besproken per operationeel doel.

5.2 Prestaties Natuur

5.2.1 Ecologische hoofdstructuur EHS


De ontwikkeling van de EHS bestaat globaal uit de onderdelen verwerving, inrichting, beheer, veenweidegebieden, ecologische verbindingzones en knelpunten. Onderstaand wordt het overzicht gegeven van de prestaties en bestedingen over de periode 2007 tot en met 2011, zoals deze door de provincies zijn opgegeven.

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011	%	BO	Realisatie T/m 2011	%
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1. Natuur EHS							
Verwerving	HA	20.734	17.103	82%	599.836	775.665	129%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	7.195		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	2.330		0	4.230	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	17.546	3.071	18%	0	0	
Overgedragen	HA	0	7.495		0	0	
Inrichting	HA	65.781	18.758	29%	468.230	183.830	39%
Beheer	HA	328.721	301.380	92%	942.452	538.532	57%
Veenweidegebied	HA	51.000	88.010	173%	7.960	4.068	51%
EVZ's	HA	1.027	52	5%	0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	36	6	17%	105.300	17.679	17%
Totaal Euro	€				2.123.778	1.524.004	72%

Tabel 5.1

Verwerving

In de onderstaande grafiek worden de cumulatieve prestaties verwerving aangegeven.

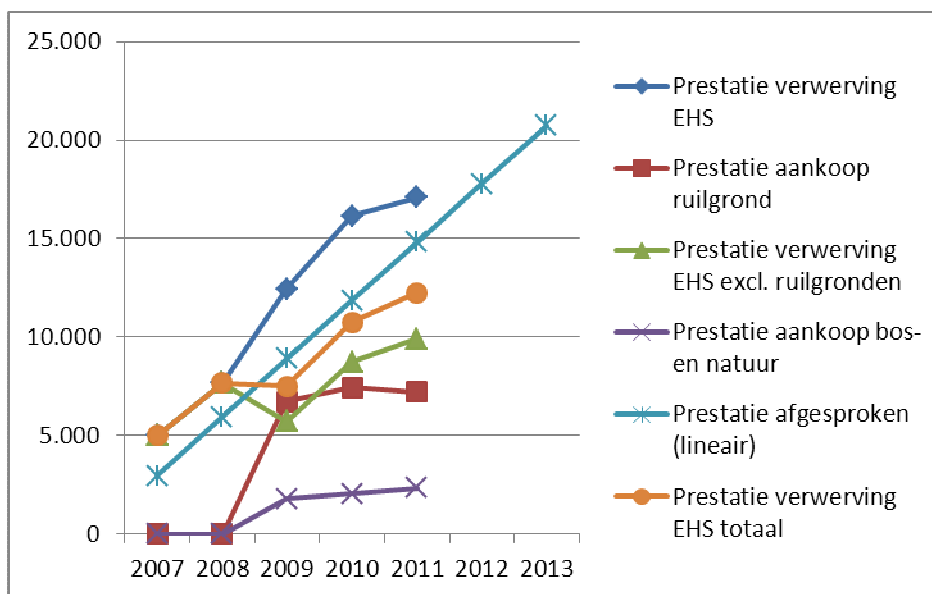


Grafiek 5.2

De 'prestatie verwerving EHS' totaal van ruim 19.000 ha is inclusief ruilgronden en natuur- en bosterreinen. De ruilgronden dienen om op een later tijdstip over te kunnen gaan tot verwerving van terrein binnen de door de provincie vastgestelde EHS begrenzingsen.

Voor de aankoop van ruilgrond en bos- en natuurterreinen zijn geen prestaties afgesproken. De aankoop van ruilgrond heeft in 2009 en 2010 plaatsgevonden. In de opgave 2011 zijn geen aankopen van ruilgronden gerapporteerd. In 2011 zijn door een aantal provincies correcties aangebracht over voorgaande jaren, waardoor de mutatie in 2011 negatief is.

In de volgende grafiek is te zien hoe de verwervingsinspanning over de periode 2007 tot en met 2011 is geweest. Hieruit blijkt dat de verwervingsinspanningen in 2011 sterk zijn afgenomen.

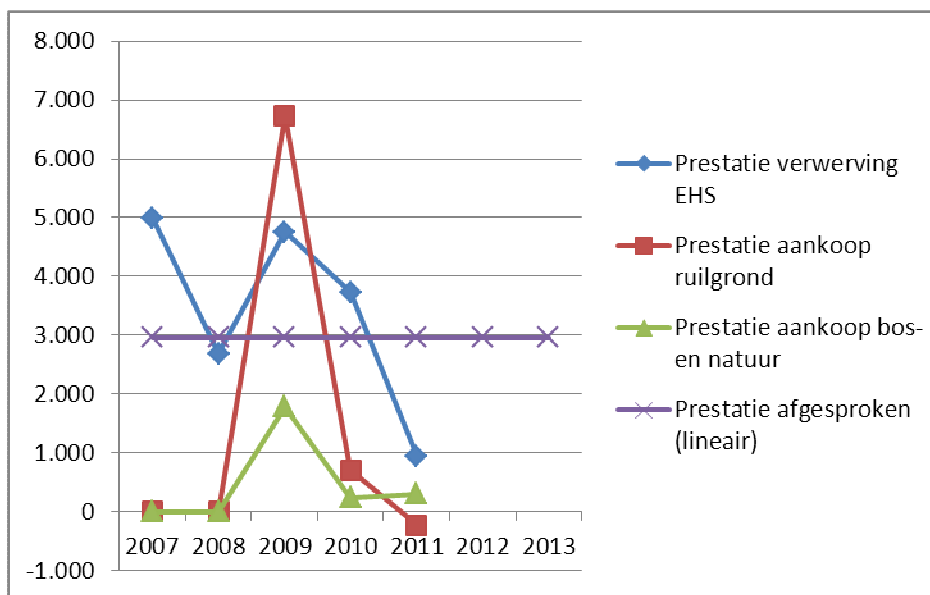


Grafiek 5.3

De inzet van BBL gronden blijft aanmerkelijk achter bij de mogelijkheden. In totaal was in 2007 ruim 17.000 hectare beschikbaar gesteld. De oorzaak van dit achterblijven zal bij de beoordeling van de prestaties per provincie nader worden onderzocht.

De inspanning voor verwerving is tot en met 2010 aanmerkelijk hoger geweest dan de aanvankelijke taakstelling.

Aan terreinbeherende organisaties is volgens opgave over de gehele periode 2007 tot en met 2011 bijna 7.500 hectare overgedragen.

De cumulatieve bestedingen voor verwerving EHS geven het volgende beeld.

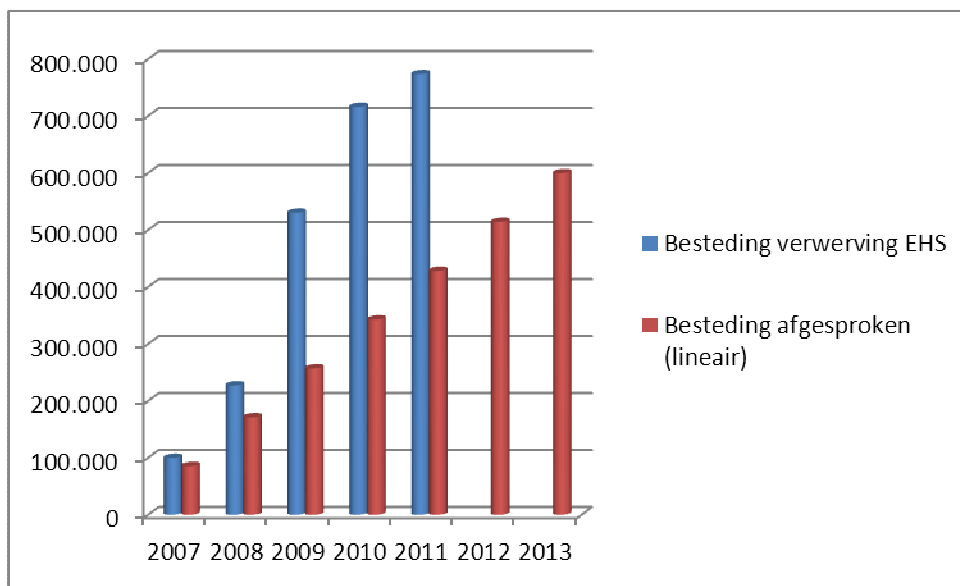

Grafiek 5.4


Het bestedingsniveau op het onderdeel verwerving is in verhouding tot de totale taakstelling ongeveer 29% hoger geweest dan de aanvankelijke afspraken. Daarmee is minder hectares aangekocht dan aanvankelijk beoogd. Er moet rekening mee worden gehouden dat ook gronden zijn verworven met gelden van derden. De omvang hiervan is door de provincies over 2010 en 2011 niet opgegeven.

Inrichting

In onze voorgaande rapportages en ook bij de Mid Term review in 2010 is reeds melding gemaakt van achterblijvende resultaten. Deze tendens heeft zich in 2011 voortgezet.


Onderstaand wordt de cumulatieve ontwikkeling van de inrichtingsactiviteiten binnen de EHS getoond.

Cumulatieve prestaties inrichting EHS ten opzicht van de prestatieafpraak

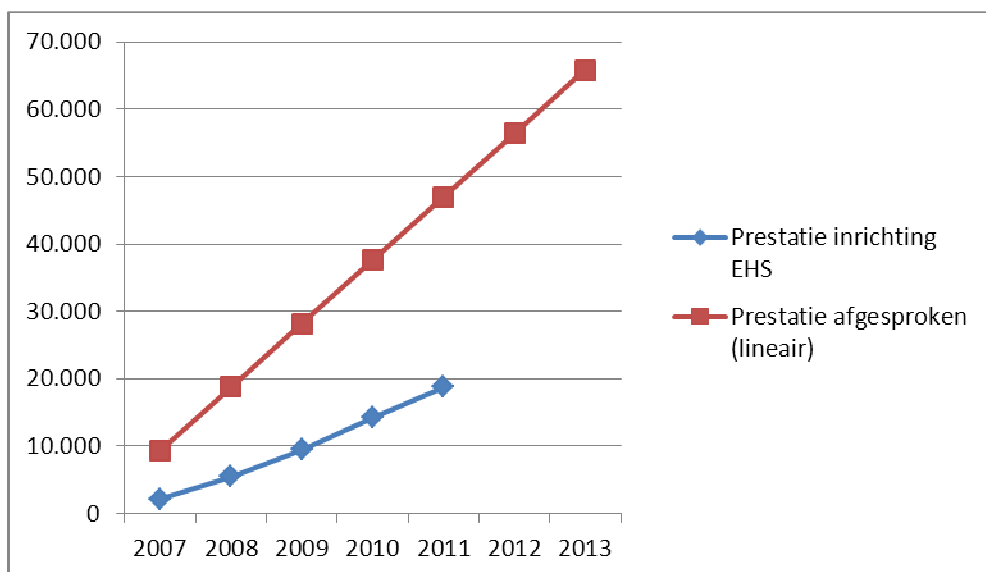

Grafiek 5.5


De ontwikkeling op jaarbasis laat zien dat tot en met 2010 sprake is geweest van een jaarlijkse toename in activiteit. Het jaar 2011 geeft echter een lichte daling te zien. Tot en met 2011 is volgens opgave ca 29% gerealiseerd.

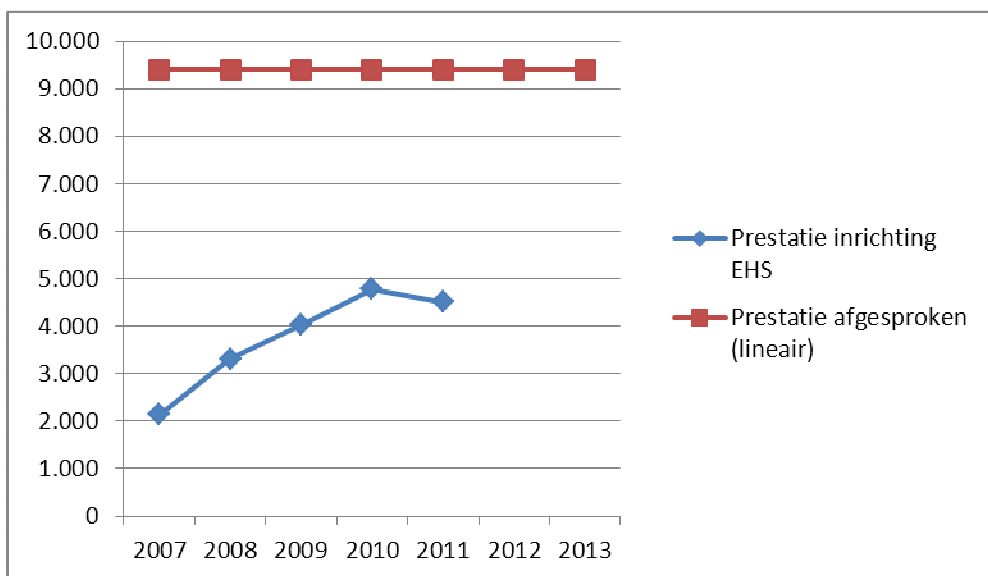

Grafiek 5.6

De bestedingen voor inrichting geven het volgende beeld.

Cumulatieve besteding inrichting EHS ten opzichte van de beschikbare rijksbijdrage

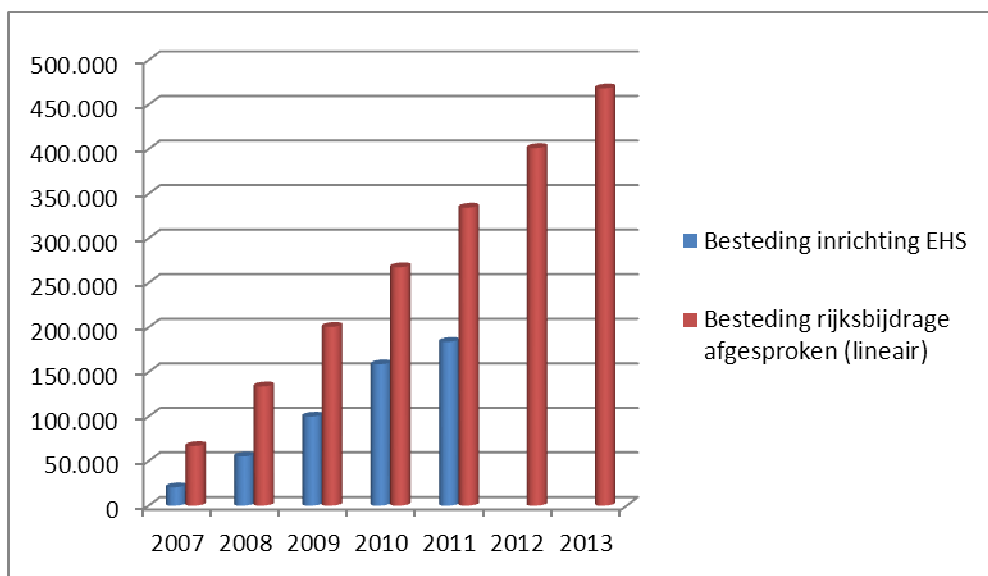


Grafiek 5.7

De bestedingen blijven zoals vermeld fors achter op de beschikbare budgetten. De bestedingen zijn ca 39% van het beschikbare budget en laten ten opzichte van de aanvankelijk afgesproken normkosten een behoorlijke overschrijding zien.

Beheer

Het beheer binnen de EHS is nog enigszins achtergebleven ten opzichte van het verwachte niveau. Het onvoldoende realiseren van de inrichting zal hier mede oorzaak van zijn.

Cumulatieve prestaties beheer EHS ten opzichte van het afgesproken niveau

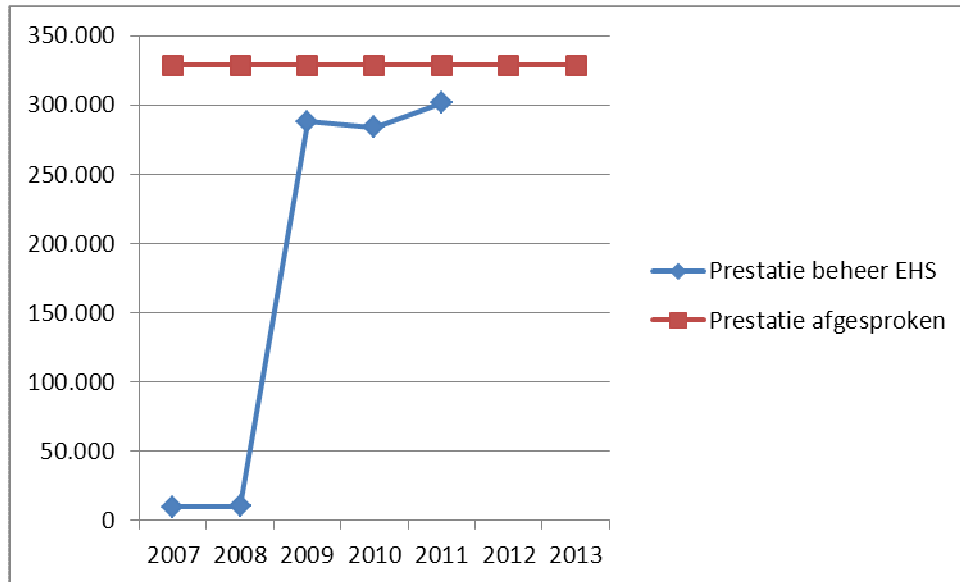

Grafiek 5.8

Overige onderwerpen EHS

De opgave 'Veenweidegebieden heeft aanmerkelijk meer prestaties opgeleverd dan aanvankelijk verwacht. In totaal zijn 88.000 hectare opgegeven tegen een voorgenomen aantal van 51.000. De opgegeven besteding zijn 59% van het beschikbare budget.

De afgesproken prestaties met betrekking tot de ecologische verbindingzones (EVZ) en de oplossing van knelpunten is hoegenaamd niet van de grond gekomen.

5.2.2 Natuur buiten de EHS

De natuurdoelen buiten de EHS bestaan uit verbetering van milieukwaliteit om te kunnen voldoen aan onder meer de Vogel – en Habitatrichtlijn (VHR), de ontwikkeling van nationale parken, soortenbescherming, inrichting rond de Westerschelde, natuurbeheer en onder meer de instandhouding van schaapskuddes (overige natuur).

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie		BO	Realisatie	
		PE	T/m 2011	%	x € 1.000	T/m 2011	%
1. Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	98.230	3.492	4%	255.480	71.760	28%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	30	0	0%			
Nationale Parken (aantal)	AANT	126	97	79%	30.761	19.246	63%
Soortenbescherming	AANT	84	69	82%	17.224	7.435	43%
Westerschelde	HA	600	385	64%	138.050	40.044	29%
Natuurbeheer buiten EHS	HA	59.958	51.781	86%	0	0	
Overig natuur	AANT	39	56	144%	11.380	4.834	42%
Totaal Euro	€				452.895	143.319	32%

Tabel 5.2

Uit de gerapporteerde cijfers blijkt dat alle onderdelen met uitzondering van milieukwaliteit goed op schema liggen binnen de beschikbaar gestelde rijksbudgetten.

Het onderdeel milieukwaliteit is nog nauwelijks van de grond gekomen. Hoewel bijna 30% van het beschikbare budget is besteed, komen de opgegeven prestaties nog niet op 5%.

5.3 Landbouw

De natuurdoelen voor het onderdeel landbouw bestaan uit zogenaamd grondgebonden landbouw waaronder verbetering van de ruimtelijke structuur, inrichting en op peil houden van de grondvoorraad. Daarnaast is budget gereserveerd voor glastuinbouw, verspreid liggend glas en duurzaam ondernemen.


Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	143.369	91.233	64%	100.310	100.722	100%
Overig landbouw	HA	800	266	33%	74.090	36.374	49%
Duurzaam ondernemen	AANT	42	27	64%	9.960	3.097	31%
Totaal Euro	€				184.360	140.193	76%

Tabel 5.3

De prestaties in het onderdeel landbouw lopen als geheel licht achter op de lineaire verwachting

Van de verbetering van de ruimtelijke structuur en inrichting wordt in de volgende grafiek een overzicht gegeven


Cumulatieve prestaties inrichting grondgebonden landbouw

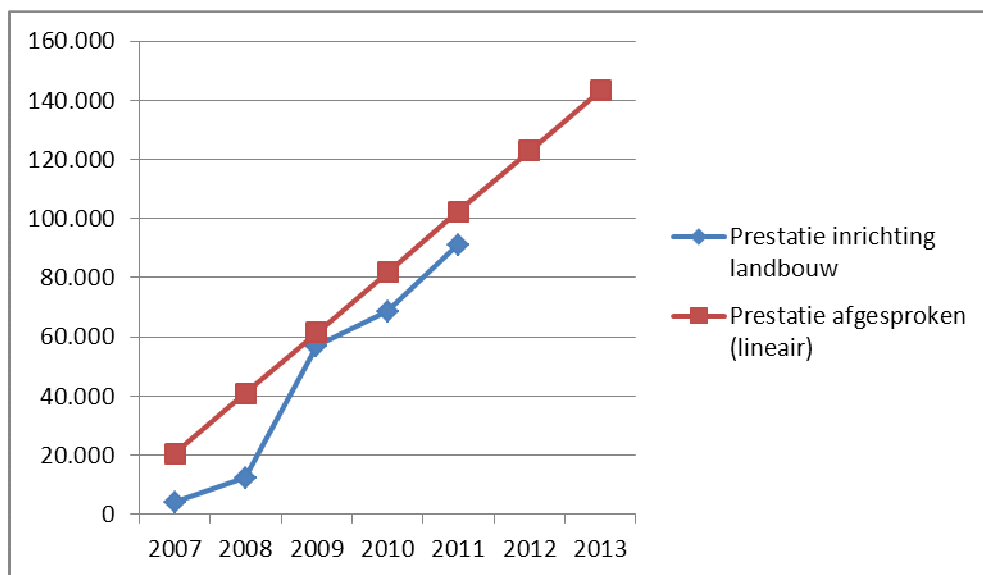

Grafiek 5.9


De prestaties per jaar geven aan dat na een neergang in 2010 de resultaten in 2011 weer een behoorlijke stijging laten zien.

Prestaties inrichting grondgebonden landbouw per jaar

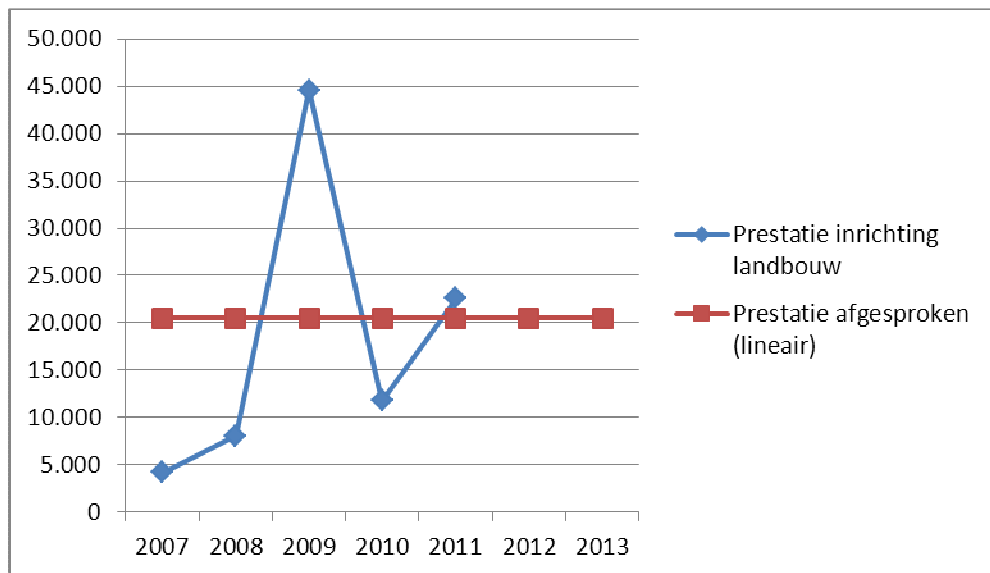

Grafiek 5.10

De bestedingen zijn aanmerkelijk hoger dan op grond van de prestaties mag worden verwacht.

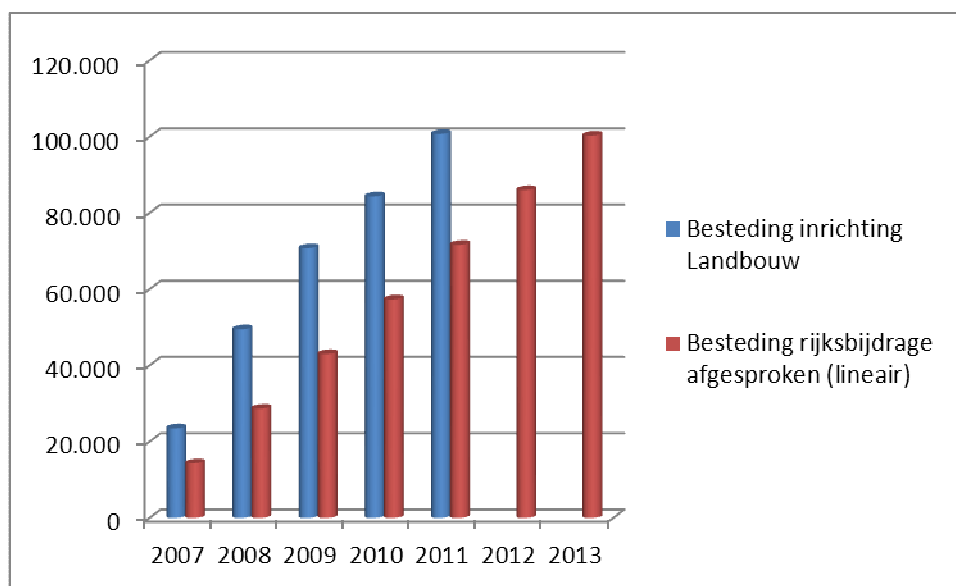

Grafiek 5.11

5.4 Recreatie

Een belangrijk onderdeel van het operationeel doel recreatie vormt de Recreatie rond de Stad (RodS), dat evenals de EHS bestaat uit verwervings- inrichtings- en beheerstaken. Daarnaast vormen het project Programma aanpassing Schiphol en Omgeving (Paso), de ontwikkeling van landelijke routenetwerken (wandelen, fietsen en varen), het ontwikkelen en versterken van de toegankelijkheid van recreatieve natuur en de natuurlijke inrichting van het Groene Hart de bestanddelen van dit ILG doel.


De gerapporteerde resultaten zijn als volgt:

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak		Prestatie	Taak		Besteding
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	3.754	1.892	50%	316.040	168.710	53%
Ruilen Rods	HA	3.577	1.193	33%	0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	1.148		0	0	
Overgedragen	HA	0	117		0	0	
PASO	HA	500	0	0%	25.900	0	
Inrichten	HA	2.064	451	22%	38.410	9.649	25%
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	4.210	1.267	30%	99.440	25.978	26%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	468	0	0%			
Beheer	HA	133.713	180.093	135%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		27.800	10.088	36%
Landelijke routenetwerken	AANT	144	128	89%	39.230	11.653	30%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	2.677	1.827	68%			
Totaal Euro	€				546.820	226.078	41%

Tabel 5.4

Verwerving

Cumulatieve prestatie verwerving recreatie om de stad (Rods)

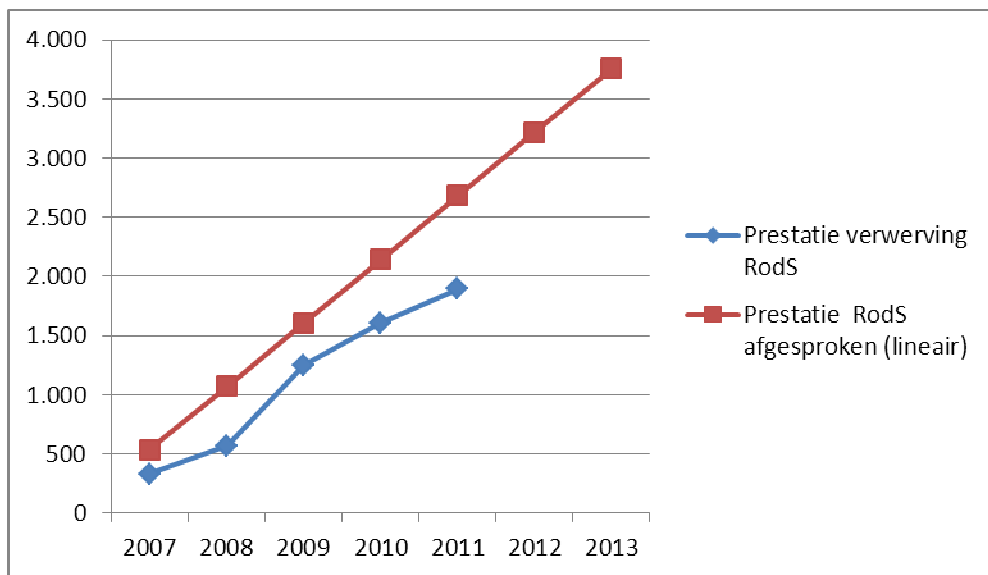


Grafiek 5.12

Ten behoeve van RodS is 1.892 ha verworven, waarvan 1.193 als ruilgronden. Er is volgens opgave 1.148 ha BBL grond ingezet en 117 ha overgedragen aan terreinbeheerders. Deze uitkomsten betekenen dat de realisatie van RodS nog ver verwijderd is.

Op jaarbasis geeft de verwerving het volgende beeld. Daaruit blijkt dat de verwervingsinspanningen over 2010 en 2011 aanzienlijk lager zijn geweest dan in 2009.


Prestatie verwerving recreatie om de stad (Rods) per jaar

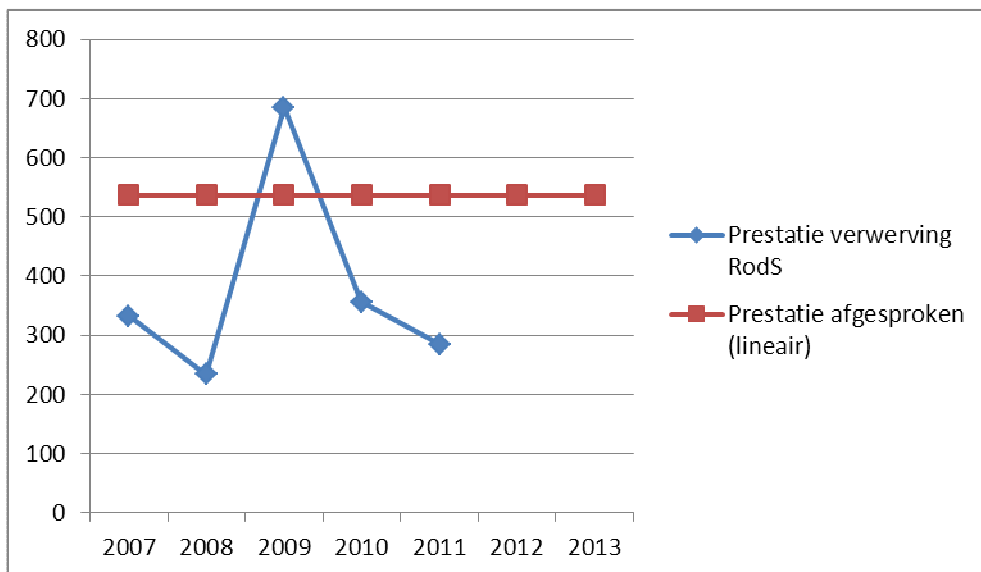

Grafiek 5.13

Onderstaand worden de cumulatieve bestedingen gegeven voor de verwerving van grond voor RodS.

Cumulatie bestedingen Rods

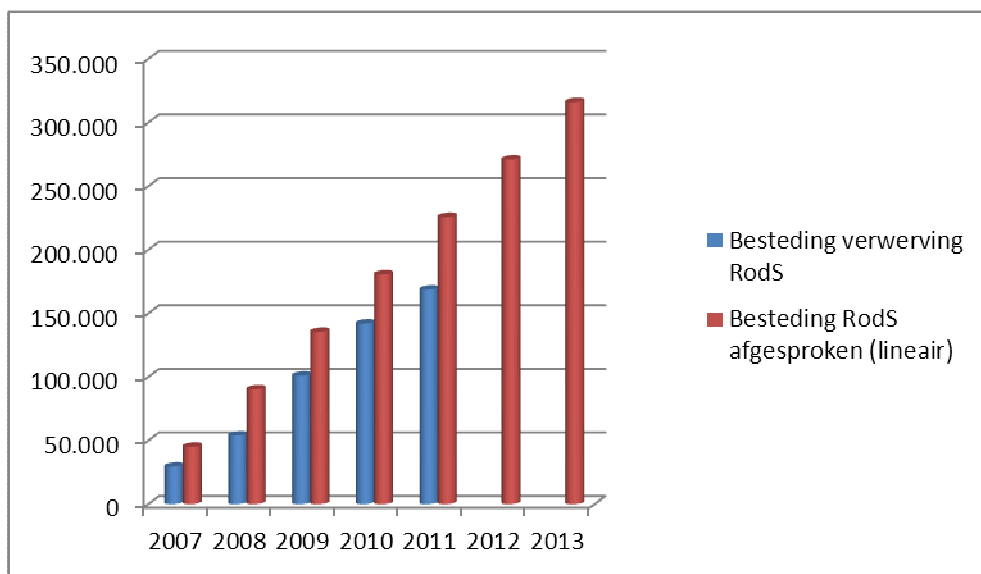


Grafiek 5.14

De verwervingsprestatie, inclusief ruilgrond (50%) heeft 53% van het beschikbare budget gekost.


Inrichting

De inrichting van recreatiegebieden blijft fors achter ten opzichte van de gemaakte afspraken, zoals uit onderstaande grafieken blijkt.

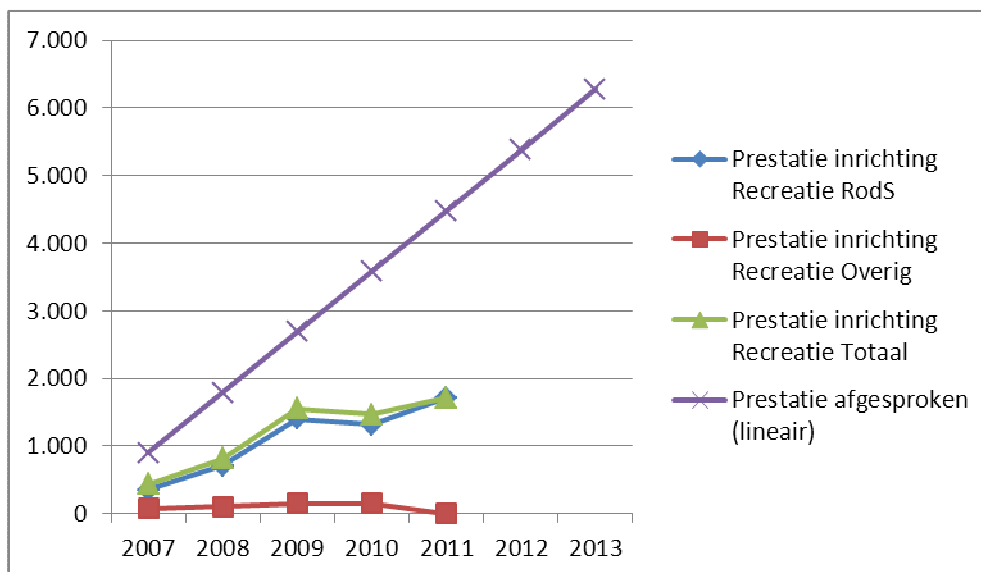Cumulatieve prestaties inrichting ten opzichte van de afgesproken prestaties

Grafiek 5.15

De bestedingen voor inrichting recreatie zijn eveneens fors achtergebleven en is sprake van onderbesteding ten opzichte van de gerapporteerde prestaties.

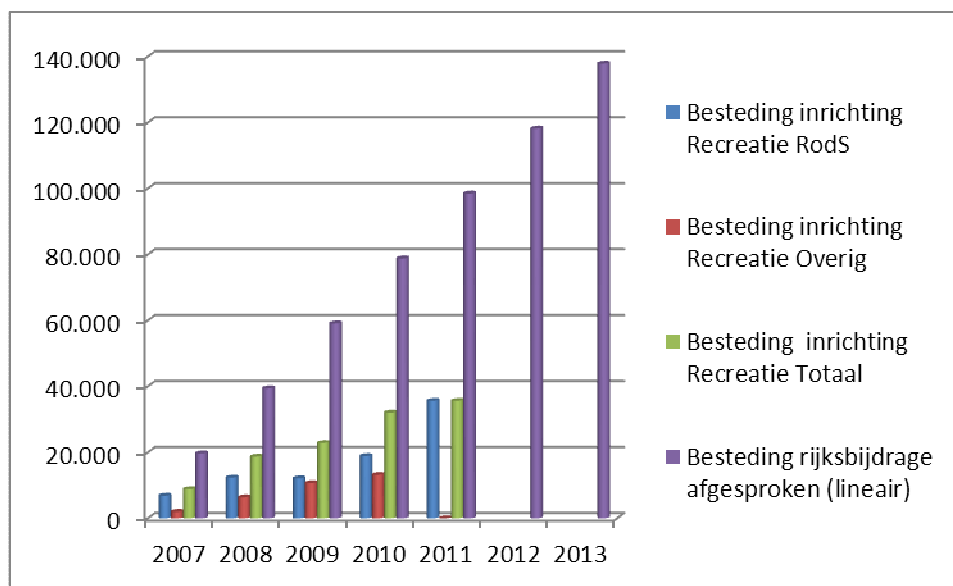
Cumulatieve bestedingen inrichting ten opzichte van de rijksbijdrage

Grafiek 5.16

Beheer recreatie

De cumulatieve prestatie voor beheer gaat aanmerkelijk uit boven de verwachting. De oorzaken hiervan moeten nog nader worden onderzocht, gezien de achterblijvende resultaten voor verwerving en inrichting.

Cumulatieve prestaties beheer recreatie

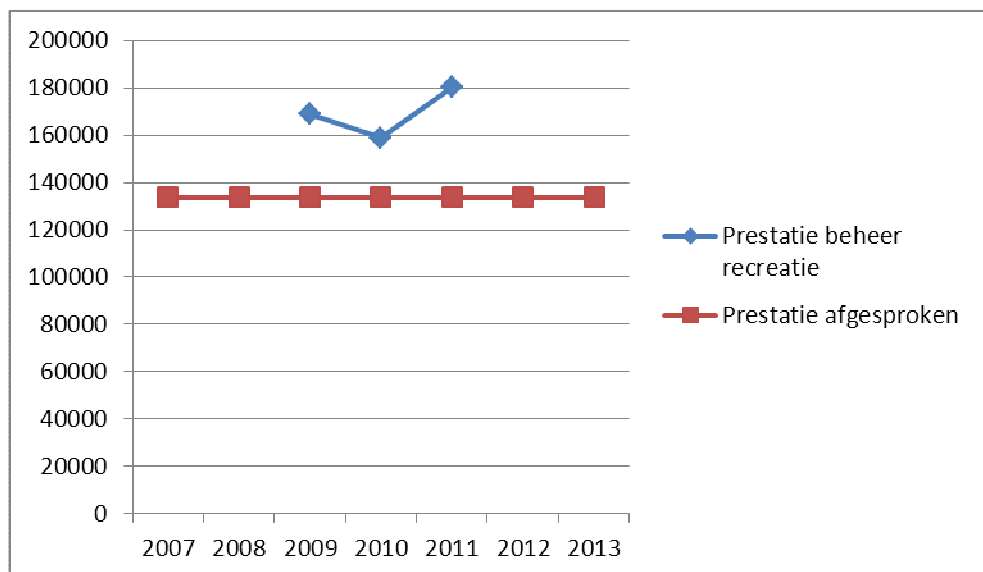

Grafiek 5.17

Overige onderwerpen recreatie

Groene Hart

Over de prestaties zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar. Wel kan worden vastgesteld dat ongeveer 36% van het beschikbare budget is besteed.

Landelijke routenetwerken

De routenetwerken zowel in aan te leggen hectares als in kilometers liggen vrijwel op schema. De bestedingen blijven achter ten opzichte van het beschikbare budget.

5.5 Landschap

De investering in nationale landschappen betreft het ontwikkelen en het verzorgen van cultuurhistorie, bijdragen aan de provinciale stichtingen landschapsbeheer, het inrichten van bos en landschap in landinrichtingsprojecten, alsmede landschapgenerieke activiteiten in het kader van de inrichting van ruimtelijke structuren.


Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
4 Landschap							
Inrichten	HA	2.946	1.914	65%	40.660	45.498	112%
Inrichten	KM	2.403	0	0%			
Beheer	HA	7.909	84.879		0	0	
Overig landschap	HA	0	512	100%	86.318	10.123	79%
Overig landschap	AAANT	12	126	1050%		21.423	
Overig landschap	OPP	16	3	19%		36.356	
Totaal Euro	€				126.978	113.400	89%

Tabel 5.5

Inrichting landschap

Van het onderdeel inrichting kan het volgende beeld worden gegeven.


Cumulatieve prestaties inrichting in hectares

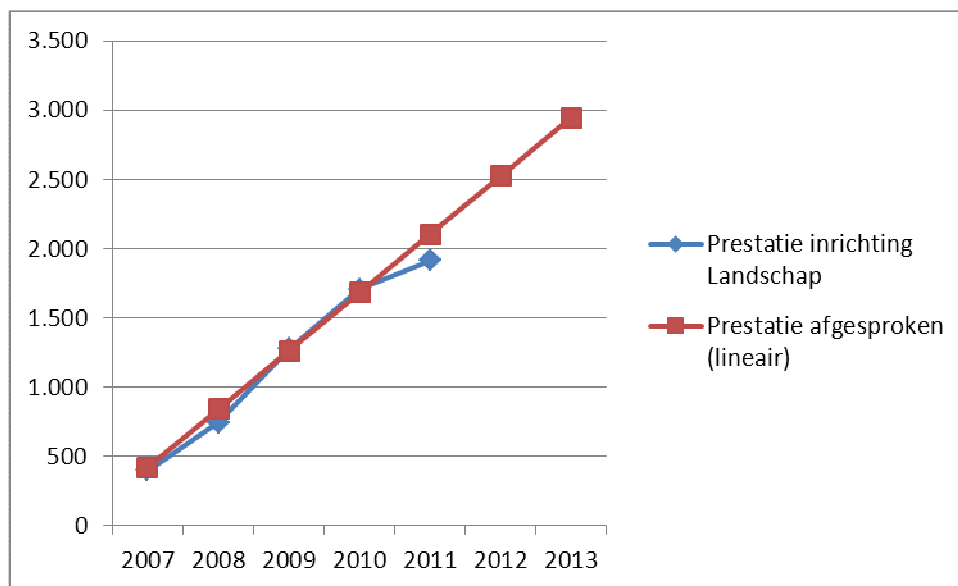

Grafiek 5.18

Hieruit lijkt naar voren te komen dat sprake is van lichte stagnatie.

Cumulatieve bestedingen landschap ten opzichte van de rijksbijdrage

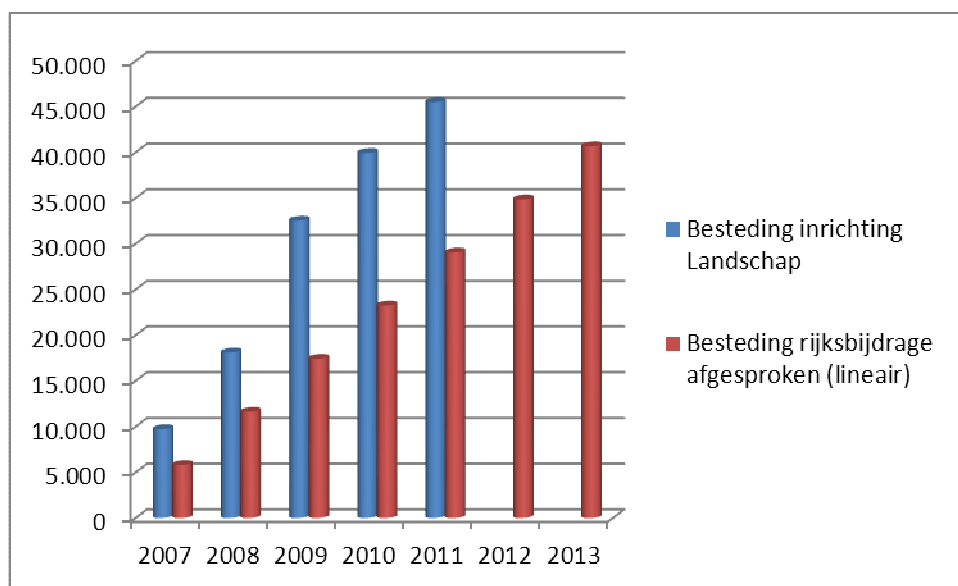


Grafiek 5.19

Inrichting landschap laat bij licht achterblijvende prestaties een forse overschrijding zien van de beschikbare rijksbijdrage.

Beheer landschap

De beheersinspanning ten behoeve van landschap is aanmerkelijk hoger dan verwacht. De oorzaken hiervan zullen nog nader worden onderzocht. Bij de indiening van de cijfers over 2011 zijn forse aanpassingen aangebracht.

Cumulatieve prestaties beheer landschap in hectares

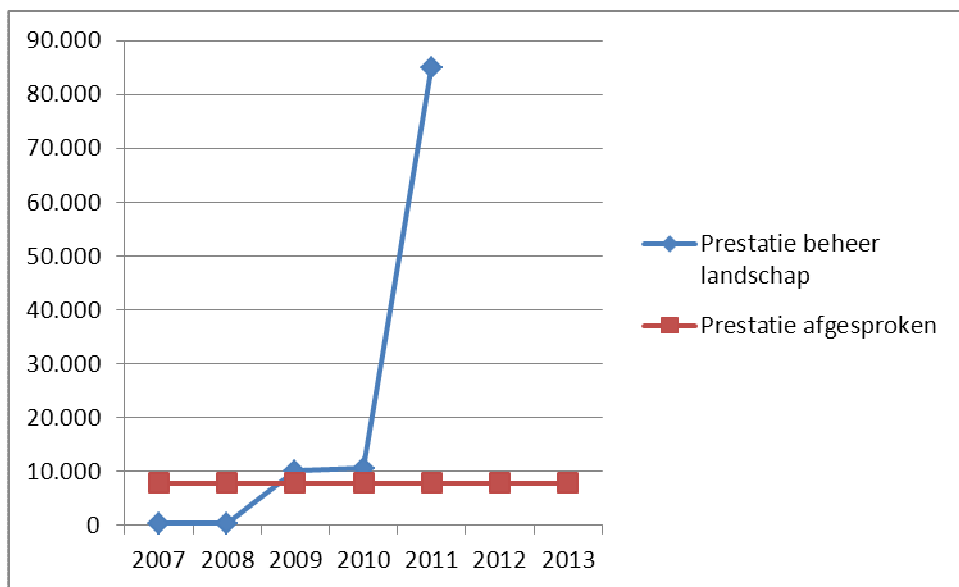

Grafiek 5.20

5.6 Bodem

Dit doel betreft duurzaam bodemgebruik (Pilots bodeminformatie en provinciale bodemvisie).

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	49	24	49%			
Totaal Euro	€				5.250	1.830	35%

Tabel 5.6

5.7 Water

Dit onderdeel betreft Waterkwaliteit (Waterbodemsanering 2010-2013) en Water (Synergiegelden)

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	83	52	63%			
Totaal Euro	€				129.442	21.886	17%

Tabel 5.7

5.8 Aandachtsgebieden

Hieronder vallen de volgende aandachtsgebieden (de bedragen zijn opgenomen in de ILG beschikkingen).

	X € 1.000	X € 1.000
EHS- flankerend beleid; Terugdringen ammoniakemmissie	44.170	
Duurzaam waterbeheer	66.020	
Duurzame landbouw	109.190	
Overige rijksdoelen	27.150	
Uitfinancieren lopende verplichtingen Reconstructie Zandgebieden	42.670	
Totaal reconstuctie zandgebieden		289.200
Veenweidegebieden		92.015
Greenports		82.980
Nieuwe Hollandse Waterlinie		33.600
Overig		74.101
Totaal		571.896

De opgegeven prestaties en bestedingen zijn als volg

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	57.931	8.006	14%			
Totaal aantallen	AANT	1.336	591	44%			
Totaal oppervlakte	OPP	284	109.900				
Totaal km	KM	336	55	16%			
Totaal Bpe	BPE	2.887.535	656.324	23%			
Totaal Euro	€				571.896	285.098	50%

Tabel 5.8

Nadere informatie over de resultaten en bestedingen van dit onderdeel is nog niet beschikbaar.

5.9 Vitaliteit

Dit betreft de leefbaarheid Sociaal Economische Vitaliteit


Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	37				
Totaal Euro	€				10.000	4.148	41%

Tabel 5.9

De inspanningen op dit onderdeel zijn achtergebleven. Slechts één provincie heeft het volledige budget ingezet.


5.10 Samenvatting beheer

De totale prestatie beheer (EHS, natuur buiten EHS, Recreatie en Landschap samen) geeft het volgende beeld.

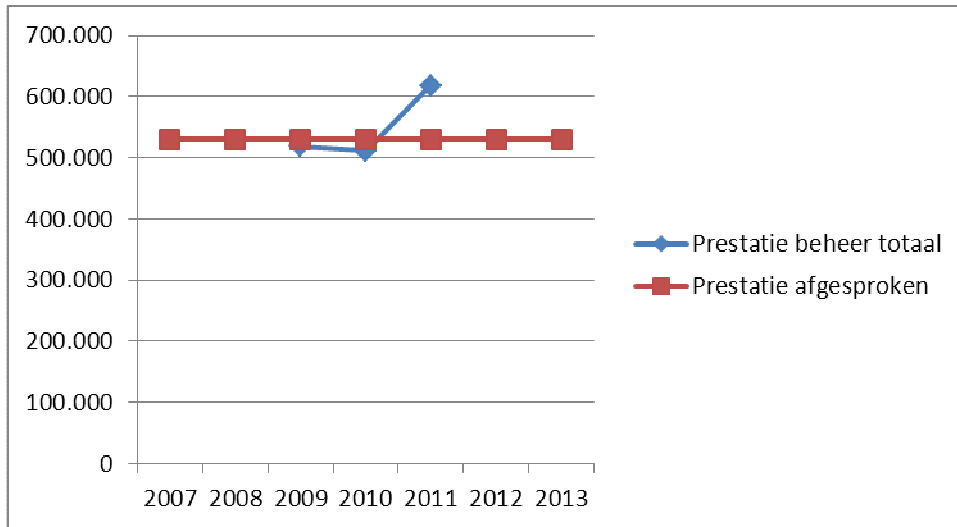

Grafiek 5.21

In de voortgangsrapportages zijn de bestedingen niet afzonderlijk opgenomen, maar als totaal van alle categorieën bij het onderdeel EHS.

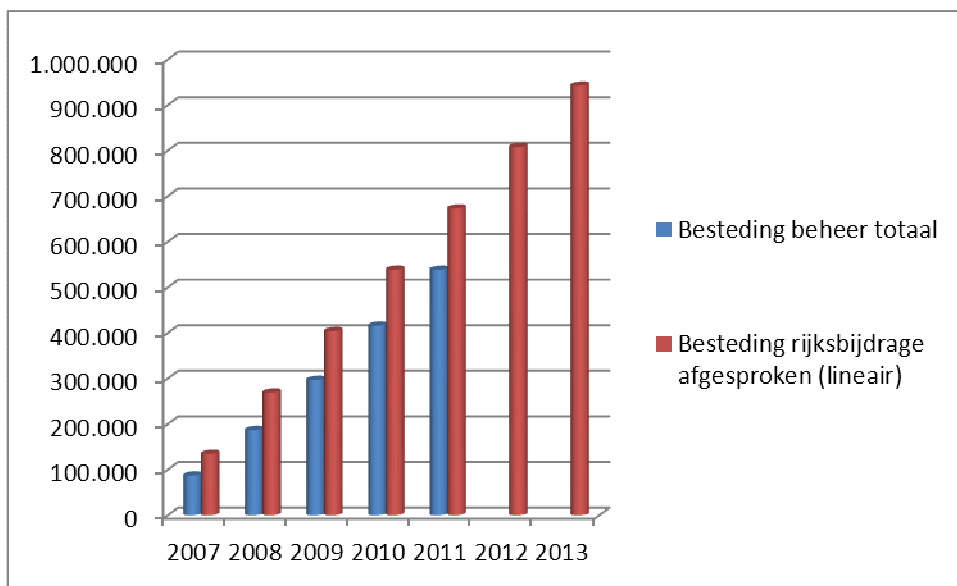

Grafiek 5.22

6. Betekenis van de uitgevoerde accountantscontrole voor de vaststelling van prestaties en bestedingen

In de 5^e rapportage van het Comité is een uitleg gegeven van de wijze waarop in hoofdlijnen de accountantscontrole van de bestedingen uit het ILG is geregeld. Zoals vermeld heeft het Comité nader onderzoek laten verrichten naar de betekenis van de beschikbare (accountants) controle verklaring voor de verantwoording van ILG prestaties en bestedingen. Voor de prestatiebeoordeling door het CvT ILG is het van belang te kunnen beschikken over betrouwbare informatie van de bestedingen per provincie.

Volgens de WILG rapporteren de provincies jaarlijks over de voortgang van het ILG (zie WILG artikel 12, eerste lid), gevolgd door een verantwoording na de periode van zeven jaar (zie WILG artikel 12 derde lid, artikel 7 eerste lid onderdeel a). De verantwoordingen bevatten zowel de financiële bijdragen aan het ILG (Rijk, provincie en derden) als prestaties.

Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat het ministerie in samenwerking met het IPO in 2008 een opzet heeft gemaakt voor de wijze van verantwoorden door de provincies, de controle van de financiële cijfers en de beoordeling van de prestaties. De afspraken voor de controle op de financiële cijfers ILG zijn in hoofdlijnen als volgt:

- De provincies verstrekken aan het Rijk een jaarlijkse (accountants)controleverklaring over de (cumulatief) bestede rijksbijdragen ILG. In deze verklaring wordt aangegeven dat de informatie rechtstreeks uit de jaarrekening van de provincie is af te leiden. Indien nodig wordt aanvullend een rapport van bevindingen verstrekt door de accountant;
- De provincies geven een volledige (accountants)controleverklaring en een rapport van bevindingen bij het eindverslag in 2014.

Over de periode 2007 tot en met 2011 is de controle van de externe accountants van de provincies om doelmatigheidsredenen ondersteund door de auditdienst van het Rijk. Deze ondersteuning betreft de uitgaven en ontvangsten die via de Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Dienst Regelingen (DR) zijn uitgevoerd. Deze diensten zijn als onderdeel van het ministerie door de eigen auditdienst gecontroleerd. Deze uitgaven en ontvangsten vormen een belangrijk gedeelte van ILG bestedingen. De controleuitkomsten zijn op basis van afspraken door de auditdienst gerapporteerd aan de provinciale accountants ten behoeve van hun controle op de jaarrekening van de provincie. De controle van de auditdienst is blijkens het onderzoek (nog) niet gericht geweest op de controle van de rijksbijdrage in het ILG als onderdeel van de rijksbegroting. Dit laatste is van belang omdat de controle-eisen voor provinciale jaarrekeningen en de rijksrekening niet gelijk zijn.

De controle werkzaamheden van de provinciale accountants gedurende de ILG periode zijn aan te merken als tussentijdse voorbereidende werkzaamheden voor de accountantscontrole van de financiële bijdragen van het Rijk oorspronkelijk in 2014.

Door het sluiten van het natuurakkoord is de voorgenomen ILG periode van 7 jaar tussentijds afgebroken en zal een aangepaste invulling moeten worden gegeven aan de accountantscontrole van de rijksbijdragen.

7. Werkwijze CvT ILG in verband met de prestatievaststelling

In bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van IPO en voormalig staatssecretaris Bleker zijn afspraken gemaakt over de implementatie van het natuurakkoord. Een element daarin is om op zo kort mogelijke termijn tot een afwikkeling te komen van de periode 2007 tot en met 2010. In ambtelijk overleg tussen het ministerie van EL&I en het IPO met het Comité van Toezicht ILG zijn inmiddels afspraken gemaakt over een plan van aanpak en de daarbij te volgen procedures.

De verantwoordelijkheid van het CvT ILG is om de bereikte resultaten vast te stellen, zodat een basis aanwezig is voor de afwikkeling van de bestuursovereenkomsten⁷.

In en bij de bestuursovereenkomsten zijn concrete afspraken gemaakt over de definitie van een prestatie (hectares, aantallen, kilometers, etc.), gerelateerd aan het te bereiken doel. Het CvT zal deze prestatie omschrijvingen hanteren. De gewenste doelen zijn geformuleerd in het provinciaal meerjarenplan en voor vele onderdelen nader geconcretiseerd in de oorspronkelijke bestuursovereenkomsten.

De voortgangsrapportages ILG van de afzonderlijke provincie over de periode 2007 tot en met 2010 vormen voor het Comité de basis voor de beoordeling van de prestaties. Het Comité is bezig de beschikbare informatie te ordenen en te analyseren. De uitkomsten hiervan zullen aan de provincies worden voorgelegd ter afstemming.

Gezien de omvang en de gevarieerdheid van de gerapporteerde prestaties zal het Comité de beoordeling in fasen verdelen:

1. Inrichting (per gebied) EHS, Landbouw, Recreatie en Landschap en de overige ILG doelen, met uitzondering van verwerving en beheer
2. Verwerving (aankoop, verkoop, ruiling, overdrachten)
3. Beheer EHS, Natuur buiten EHS, Recreatie, en Landschap.

In Januari 2013 zal worden gestart met het voorleggen van de aan het Comité beschikbaar gestelde informatie aan de afzonderlijke provincies. Daarbij zal worden gevraagd geconstateerde verschillen toe te lichten. Tevens zal worden gevraagd naar de stand van de gebiedsontwikkeling per 1 januari 2011. Het Comité streeft er naar zijn werkzaamheden mede in het licht van de afwikkelings-overeenkomsten tussen rijke en provincies van 23 November 2012 zo spoedig mogelijk af te ronden.

Het Comité zal naast de nodige administratieve afstemmingen, visitaties ter plaatse uitvoeren.

Elke fase zal in overleg met gedeputeerde staten van de provincie worden afgesloten met een voorlopige rapportage. Daaraan zullen de opvattingen van de provincie, als zichtbaar resultaat van 'hoor- en weder hoor', integraal worden toegevoegd in de eindrapportage van het Comité. De eindrapportage zal ter beschikking worden gesteld aan het College van gedeputeerde staten en aan de verantwoordelijke bewindspersoon van het rijk.

⁷ In de 5^e rapportage van het Comité is meer uitvoerig ingegaan op de wijze van beoordeling van provinciale prestaties in het kader van de geldende bestuursovereenkomsten.

Annex 1 Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie tot en met 2011

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	20.734	17.103	82%	599.836	775.665	129%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	7.195		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	2.330		0	4.230	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	17.546	3.071	18%	0	0	
Overgedragen	HA	0	7.495		0	0	
Inrichting	HA	65.781	18.758	29%	468.230	183.830	39%
Beheer	HA	328.721	301.380	92%	942.452	528.532	57%
Veenweidegebied	HA	51.000	88.010	173%	7.960	4.068	51%
EVZ's	HA	1.027	52	5%	0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	36	6	17%	105.300	17.679	17%
Totaal Euro	€				2.123.778	1.524.004	72%
1 Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	98.230	3.492	4%	255.480	71.760	28%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	30	0	0%			
Nationale Parken (aantal)	AANT	126	97	79%	30.761	19.246	63%
Soortenbescherming	AANT	84	69	82%	17.224	7.435	43%
Westerschelde	HA	600	385	64%	138.050	40.044	29%
Natuurbeheer buiten EHS	HA	59.958	51.781	86%	0	0	
Overig natuur	AANT	39	56	144%	11.380	4.834	42%
Totaal Euro	€				452.895	143.319	32%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	143.369	91.233	64%	100.310	100.722	100%
Overig landbouw	HA	800	266	33%	74.090	36.374	49%
Duurzaam ondernemen	AANT	42	27	64%	9.960	3.097	31%
Totaal Euro	€				184.360	140.193	76%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	3.754	1.892	50%	316.040	168.710	53%
Ruilen Rods	HA	3.577	1.193	33%	0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	1.148		0	0	
Overgedragen	HA	0	117		0	0	
PASO	HA	500	0	0%	25.900	0	
Inrichten	HA	2.064	451	22%	38.410	9.649	25%
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	4.210	1.267	30%	99.440	25.978	26%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	468	0	0%			
Beheer	HA	133.713	180.093	135%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		27.800	10.088	36%
Landelijke routenetwerken	AANT	144	128	89%	39.230	11.653	30%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	2.677	1.827	68%			
Totaal Euro	€				546.820	226.078	41%
4 Landschap							
Inrichten	HA	2.946	1.914	65%	40.660	45.498	112%
Inrichten	KM	2.403	0	0%			
Beheer	HA	7.909	84.879		0	0	
Overig landschap	HA	0	512	100%	86.318	10.123	79%
Overig landschap	AANT	12	126	50%		21.423	
Overig landschap	OPP	16	3	19%		36.356	
Totaal Euro	€				126.978	113.400	89%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	49	24	49%			
Totaal Euro	€				5.250	1.830	35%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	83	52	63%			
Totaal Euro	€				129.442	21.886	17%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	57.931	8.006	14%			
Totaal aantallen	AANT	1.336	591	44%			
Totaal oppervlakte	OPP	284	109.900				
Totaal km	KM	336	55	16%			
Totaal Bpe	BPE	2.887.535	656.324	23%			
Totaal Euro	€				571.896	285.098	50%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	37				
Totaal Euro	€				10.000	4.148	41%
Totaal Euro	€				4.151.419	2.459.956	59%
Financiering PNB/POP BBL					-432.699	-186.337	
Totaal via ILG					3.718.720	2.273.619	

Groningen	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
Natuur EHS							
Verwerving	HA	913	1.673	183%	18.374	11.796	64%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	0		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.525	0	0%	0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
Inrichting	HA	5.209	1.665	32%	25.510	15.584	61%
Beheer	HA	14.550	11.167	77%	59.074	35.863	61%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	6	4	67%	19.200	409	2%
Totaal Euro	€				122.158	63.652	52%
Buiten EHS							
Milieuwaliteit EHS/VHR	HA	3.672	0	0%	10.460	6.580	63%
Milieuwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	7	5	71%	799	700	88%
Soortenbescherming	AANT	7	8	114%	1.102	547	50%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	3.580	5.617	157%	0	0	
Overig natuur	AANT	1	0	0%	150	0	0%
Totaal Euro	€				12.511	7.827	63%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	14.448	26.388	183%	8.330	6.464	78%
Overig landbouw	HA	0	0		14.830	7.717	52%
Duurzaam ondernemen	AANT	7	11	157%	830	162	20%
Totaal Euro	€				23.990	14.343	60%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	33	0	0%	589	506	86%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	25	0	0%			
Beheer	HA	1.606	9.909		0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	9	3	33%	3.429	318	9%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	250	105	42%			
Totaal Euro	€				4.018	824	21%
4 Landschap							
Inrichten	HA	194	138	71%	2.890	2.209	76%
Inrichten	KM	71	0	0%			
Beheer	HA	250	11.518		0	0	
Overig landschap	HA	0	0		3.772	599	68%
Overig landschap	AANT	0	0			1.806	
Overig landschap	OPP	1	0			173	
Totaal Euro	€				6.662	4.787	72%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	3	0	0%			
Totaal Euro	€				450	0	0%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				5.329	0	0%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	0	
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	132	16%
Totaal Euro	€				175.951	91.565	52%
Financiering PNB/POP BBL					-18.824	-3.909	
Totaal via ILG					157.127	87.656	

Friesland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie		BO	Realisatie	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	2.250	906	40%	44.710	17.665	40%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	433		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	208		0	1.389	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.662	569	34%	0	0	
Overgedragen	HA	0	1.147		0	0	
Inrichting	HA	6.346	3.047	48%	47.860	18.425	38%
Beheer	HA	33.941	32.662	96%	142.312	87.287	61%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	4	0	0%	8.730	127	1%
Totaal Euro	€				243.612	124.893	51%
Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	3.507	1	0%	15.010	8.140	54%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	14	10	71%	2.920	1.841	63%
Soortenbescherming	AANT	7	9	129%	1.777	389	22%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	6.095	11.619	191%	0	0	
Overig natuur	AANT	2	3	150%	240	135	56%
Totaal Euro	€				19.947	10.505	53%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	20.173	5.979	30%	12.700	19.988	157%
Overig landbouw	HA	100	0	0%	3.600	3.619	101%
Duurzaam ondernemen	AANT	9	1	11%	830	349	42%
Totaal Euro	€				17.130	23.956	140%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	27		0	0	
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	1	29		971	526	54%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	24	0	0%			
Beheer	HA	5.242	13.471		0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	12	3	25%	4.639	1.873	40%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	309	246	80%			
Totaal Euro	€				5.610	2.399	43%
4 Landschap							
Inrichten	HA	144	156	108%	4.770	3.087	65%
Inrichten	KM	223	0	0%			
Beheer	HA	1.361	2.475	182%	0	0	
Overig landschap	HA	0	507		5.762	1.211	99%
Overig landschap	AANT	0	0			1.811	
Overig landschap	OPP	2	0	0%		2.665	
Totaal Euro	€				10.532	8.832	83%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	2	0	0%			
Totaal Euro	€				450	84	19%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	4	0	0%			
Totaal Euro	€				14.153	2.445	17%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	0	
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	333	40%
Totaal Euro	€				312.267	173.389	56%
Financiering PNB/POP BBL					-43.129	-5.958	
Totaal via ILG					269.138	167.431	

Drenthe	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	1.638	1.427	87%	31.044	47.855	154%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	264		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	99		0	804	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.903	364	19%	0	0	
Overgedragen	HA	0	1.227		0	0	
Inrichting	HA	8.456	1.677	20%	46.490	24.556	53%
Beheer	HA	21.066	21.817	104%	69.580	32.737	47%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	3	0	0%	9.070	425	5%
Totaal Euro	€				156.184	106.377	68%
Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	13.316	2.269	17%	36.470	6.449	18%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	21	16	76%	5.158	3.544	69%
Soortenbescherming	AANT	7	9	129%	1.389	199	14%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	3.671	2.244	53%	0	0	
Overig natuur	AANT	6	9	150%	800	819	102%
Totaal Euro	€				43.817	11.011	25%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	13.004	8.895	68%	12.390	10.027	81%
Overig landbouw	HA	0	0		6.170	6.178	100%
Duurzaam ondernemen	AANT	1	4	400%	830	397	48%
Totaal Euro	€				19.390	16.602	86%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	6	25		1.200	441	37%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	95	0				
Beheer	HA	12.615	19.082	151%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	6	0	0%	5.342	1.888	35%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	367	7	2%			
Totaal Euro	€				6.542	2.329	36%
4 Landschap							
Inrichten	HA	720	386	54%	5.910	5.667	96%
Inrichten	KM	235	0	0%			
Beheer	HA	363	21.243		0	0	
Overig landschap	HA	0	0		4.794	33	97%
Overig landschap	AANT	1	6	0%		4.083	
Overig landschap	OPP	0	0			552	
Totaal Euro	€				10.704	10.335	97%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	2	1	50%			
Totaal Euro	€				450	68	15%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	7	0	0%			
Totaal Euro	€				11.095	3.219	29%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	82	
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	0	0%
Totaal Euro	€				249.015	150.023	60%
Financiering PNB/POP BBL					-25.772	-12.637	
Totaal via ILG					223.243	137.386	

Overijssel	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie		BO	Realisatie	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Vererving	HA	3.398	2.626	77%	94.880	119.195	126%
Vererving EHS ruilgrond	HA	0	1.513		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	42		0	278	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.667	601	36%	0	0	
Overgedragen	HA	0	711		0	0	
Inrichting	HA	7.269	1.764	24%	51.930	16.476	32%
Beheer	HA	35.381	27.149	77%	89.455	51.296	57%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	3	0	0%	9.120	26	0%
Totaal Euro	€				245.385	187.271	76%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	1.711	0	0%	23.900	4.237	18%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	14	10	71%	5.035	3.114	62%
Soortenbescherming	AANT	7	7	100%	1.777	822	46%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	6.147	3.002	49%	0	0	
Overig natuur	AANT	2	3	150%	2.090	452	22%
Totaal Euro	€				32.802	8.625	26%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	15.988	9.948	62%	10.920	5.224	48%
Overig landbouw	HA	0	0		1.400	435	31%
Duurzaam ondernemen	AANT	3	1	33%	830	700	84%
Totaal Euro	€				13.150	6.359	48%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	25	13	52%	887	1.533	173%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	45	0	0%			
Beheer	HA	17.643	23.288	132%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	20	17	85%	2.854	1.022	36%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	194	48	25%			
Totaal Euro	€				3.741	2.555	68%
4 Landschap							
Inrichten	HA	73	74	101%	4.360	2.662	61%
Inrichten	KM	408	0	0%			
Beheer	HA	1.745	1.246	71%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		6.078	0	78%
Overig landschap	AANT	2	0			1.809	
Overig landschap	OPP	0	0			2.913	
Totaal Euro	€				10.438	7.384	71%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	5	5	100%			
Totaal Euro	€				450	352	78%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	6	0	0%			
Totaal Euro	€				12.330	4.365	35%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	21.983	7.470	34%			
Totaal aantallen	AANT	54	491				
Totaal oppervlakte	OPP	256	109.900				
Totaal km	KM	88	55	63%			
Totaal Bpe	BPE	2.887.535	656.324	23%			
Totaal Euro	€				55.020	32.671	59%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	26				
Totaal Euro	€				833	154	18%
Totaal Euro	€				374.149	249.736	67%
Financiering PNB/POP BBL					-66.306	-18.416	
Totaal via ILG					307.843	231.320	

Gelderland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	1.052	1.156	110%	36.808	61.491	167%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	891		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	23		0	0	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	2.958	86	3%	0	0	
Overgedragen	HA	0	600		0	0	
Inrichting	HA	6.112	978	16%	43.640	17.844	41%
Beheer	HA	67.310	62.350	93%	141.803	87.302	62%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	6	0	0%	17.690	12.917	73%
Totaal Euro	€				239.941	179.554	75%
Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	5.218	860	16%	29.810	10.061	34%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	30	0	0%			
Nationale Parken (aantal)	AANT	0	0		0	0	
Soortenbescherming	AANT	7	0	0%	1.389	584	42%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	12.505	2.170	17%	0	0	
Overig natuur	AANT	10	10	100%	2.910	1.930	66%
Totaal Euro	€				34.109	12.575	37%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	15.351	23.185	151%	7.230	7.722	107%
Overig landbouw	HA	0	0		6.620	0	0%
Duurzaam ondernemen	AANT	0	0		830	0	0%
Totaal Euro	€				14.680	7.722	53%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	206	167	81%	16.840	24.419	145%
Ruilen Rods	HA	119	156	131%	0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	11		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	373	0	0%	8.110	0	0%
Inrichting Rods (lop. Verpl.)	HA	142	12	8%	4.785	2.030	42%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	52	0	0%			
Beheer	HA	34.891	15.152	43%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	18	43	239%	2.957	747	25%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	183	859	468%			
Totaal Euro	€				32.692	27.196	83%
4 Landschap							
Inrichten	HA	115	130	113%	1.990	1.181	59%
Inrichten	KM	259	0	0%			
Beheer	HA	2.641	1.781	67%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		14.862	0	107%
Overig landschap	AANT	7	0	0%		1.903	
Overig landschap	OPP	0	0			14.046	
Totaal Euro	€				16.852	17.130	102%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	5	4	80%			
Totaal Euro	€				450	433	96%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	11	0	0%			
Totaal Euro	€				17.005	2.203	13%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	15.050	0	0%			
Totaal aantallen	AANT	241	0	0%			
Totaal oppervlakte	OPP	24	0	0%			
Totaal km	KM	100	0	0%			
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				98.300	37.884	39%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	4				
Totaal Euro	€				833	428	51%
Totaal Euro	€				454.862	285.125	63%
Financiering PNB/POP BBL					-36.847	-1.054	
Totaal via ILG					418.015	284.071	

Utrecht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie		BO	Realisatie	
		PE	T/m 2011	%	x € 1.000	T/m 2011	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	1.494	633	42%	50.672	69.572	137%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	380		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	377		0	1500	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	672	74	11%	0	0	
Overgedragen	HA	0	188		0	0	
Inrichting	HA	3.892	307	8%	28.440	8.270	29%
Beheer	HA	16.609	15.858	95%	62.976	37.908	60%
Veenweidegebied	HA	8.734	15.292	175%	821	0	0%
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	1	0	0%	4.500	651	14%
Totaal Euro	€				147.409	117.901	80%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	6.277	0	0%	17.290	4.756	28%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	7	15	214%	2.003	522	26%
Soortenbescherming	AANT	7	11	157%	1.593	168	11%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	2.871	3.018	105%	0	0	
Overig natuur	AANT	0	1		0	42	
Totaal Euro	€				20.886	5.488	26%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	4.710	321	7%	6.530	2.852	44%
Overig landbouw	HA	0	0		0	0	
Duurzaam ondernemen	AANT	10	6	60%	830	125	15%
Totaal Euro	€				7.360	2.977	40%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	367	170	46%	27.220	18.267	67%
Ruilen Rods	HA	174	123	71%	0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	9		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	152	5	3%	3.300	529	16%
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	539	435	81%	10.329	3.040	29%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	12	0	0%			
Beheer	HA	8.997	10.524	117%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		10.800	4.698	44%
Landelijke routenetwerken	AANT	10	43		2.274	1.607	71%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	172	0	0%			
Totaal Euro	€				53.923	28.141	52%
4 Landschap							
Inrichten	HA	22	15	68%	3.520	1.328	38%
Inrichten	KM	67	0	0%			
Beheer	HA	309	12.630		0	0	
Overig landschap	HA	0	5		9.505	1.154	68%
Overig landschap	AANT	0	0			718	
Overig landschap	OPP	4	0	0%		4.617	
Totaal Euro	€				13.025	7.817	61%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	4	1	25%			
Totaal Euro	€				450	0	0%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	7	0	0%			
Totaal Euro	€				7.549	537	7%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	7.387	184	2%			
Totaal aantallen	AANT	144	55	38%			
Totaal oppervlakte	OPP	4	0	0%			
Totaal km	KM	78	0	0%			
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				61.260	16.072	26%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	1				
Totaal Euro	€				833	728	87%
Totaal Euro	€				312.695	179.661	57%
Financiering PNB/POP BBL					-39.742	-15.732	
Totaal via ILG					272.953	163.929	

Zuid Holland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	1.726	1.887	109%	63.023	108.092	172%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	855		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	7		0	0	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	2.781	622	22%	0	0	
Overgedragen	HA	0	250		0	0	
Inrichting	HA	8.264	1.362	16%	56.480	27.984	50%
Beheer	HA	22.014	17.874	81%	80.389	44.917	56%
Veenweidegebied	HA	21.660	42.431	196%	2.036	4.068	200%
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	2	0		5.200	2.609	50%
Totaal Euro	€				207.128	187.670	91%
Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	3.525	0	0%	14.320	7.043	49%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	0	0		0	0	
Soortenbescherming	AANT	7	5	71%	1.102	329	30%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	3.982	5.518	139%	0	0	
Overig natuur	AANT	1	0	0%	1.200	289	24%
Totaal Euro	€				16.622	7.661	46%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	9.585	2.464	26%	4.330	11.079	256%
Overig landbouw	HA	200	0	0%	20.730	8.884	43%
Duurzaam ondernemen	AANT	1	0	0%	830	350	42%
Totaal Euro	€				25.890	20.313	78%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	2.082	1.120	54%	177.960	84.946	48%
Ruilen Rods	HA	2.094	482	23%	0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	616		0	0	
Overgedragen	HA	0	69		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	814	0	0%	17.700	7.873	44%
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	2.072	579	28%	50.979	10.866	21%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	63	0	0%			
Beheer	HA	2.475	6.287	254%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		16.000	5.290	33%
Landelijke routenetwerken	AANT	17	2	12%	3.790	758	20%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	218	295	136%			
Totaal Euro	€				266.429	109.733	41%
4 Landschap							
Inrichten	HA	204	219	107%	1.110	2.525	227%
Inrichten	KM	84	0	0%			
Beheer	HA	306	396	129%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		0	2.489	
Overig landschap	AANT	0	0		2.159	1.448	67%
Overig landschap	OPP	3	3	100%	7.600	4.726	62%
Totaal Euro	€				10.869	11.188	103%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	6	1	17%			
Totaal Euro	€				450	263	58%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	9	0	0%			
Totaal Euro	€				15.154	1.896	13%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	11	0	0%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				129.896	80.794	62%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	139	17%
Totaal Euro	€				673.271	419.657	62%
Financiering PNB/POP BBL					-27.361	-23.824	
Totaal via ILG					645.910	395.833	

Noord Holland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	1.458	661	45%	37.849	38262	101%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	239		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	101		0	0	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.467	92	6%	0	0	
Overgedragen	HA	0	210		0	0	
Inrichting	HA	3.540	2.462	70%	22.260	9.393	42%
Beheer	HA	23.812	20.508	86%	83.033	49.678	60%
Veenweidegebied	HA	9.606	16.684	174%	903	0	0%
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	2	0	0%	590	0	0%
Totaal Euro	€				144.634	97.333	67%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	22.665	72	0%	26.240	4.913	19%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	14	6	29%	3.208	2.156	67%
Soortenbescherming	AANT	7	0	0%	1.389	144	10%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	4.284	5.918	138%	0	0	
Overig natuur	AANT	3	0	0%	270	0	0%
Totaal Euro	€				31.107	7.213	23%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	9.369	2.236	24%	4.530	6.239	138%
Overig landbouw	HA	0	0		2.600	0	0%
Duurzaam ondernemen	AANT	0	1		830	626	75%
Totaal Euro	€				7.960	6.865	86%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	1.099	435	40%	94.020	41.078	44%
Ruilen Rods	HA	1.190	432	36%	0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	532		0	0	
Overgedragen	HA	0	28		0	0	
PASO	HA	500	0	0%	25.900	0	0%
Inrichten	HA	725	446	62%	9.300	1.247	13%
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	1.364	127	9%	25.228	4.026	16%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	14	0	0%			
Beheer	HA	5.952	17.855	300%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		1.000	100	10%
Landelijke routenetwerken	AANT	18	6	33%	4.037	1.715	42%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	266	122	46%			
Totaal Euro	€				159.485	48.166	30%
4 Landschap							
Inrichten	HA	25	1	4%	1.290	244	19%
Inrichten	KM	49	0	0%			
Beheer	HA	276	20.998		0	0	
Overig landschap	HA	0	0		11.698	2.088	68%
Overig landschap	AANT	0	0			1.824	
Overig landschap	OPP	4	0	0%		3.990	
Totaal Euro	€				12.988	8.146	63%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	1	1	100%			
Totaal Euro	€				450	25	6%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	9	0	0%			
Totaal Euro	€				13.734	124	1%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	4	0	0%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				65.280	6.803	10%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	552	66%
Totaal Euro	€				436.472	175.227	40%
Financiering PNB/POP BBL					-33.701	-18.840	
Totaal via ILG					402.771	156.387	

Limburg	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	1.988	1.880	95%	63.017	90.747	144%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	1.302		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	683		0	259	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	440	69	16%	0	0	
Overgedragen	HA	0	523		0	0	
Inrichting	HA	3.995	1.372	34%	65.180	22.122	34%
Beheer	HA	23.797	21.152	89%	76.696	41.730	54%
Veenweidegebied	HA	11.000	13.603	124%	4.200	0	0%
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	3	0	0%	14.400	158	1%
Totaal Euro	€				223.493	155.016	69%
Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	20.119	0	0%	23.240	3.822	16%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	21	15	71%	4.229	2.612	62%
Soortenbescherming	AANT	7	1	14%	1.753	2.622	150%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	4.140	2.657	64%	0	0	
Overig natuur	AANT	8	24	300%	950	751	79%
Totaal Euro	€				30.172	9.807	33%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	6.300	1.137	18%	10.960	6.800	62%
Overig landbouw	HA	0	0		0	0	
Duurzaam ondernemen	AANT	0	0		830	0	0%
Totaal Euro	€				11.790	6.800	58%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	4	3	75%	1.261	-326	
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	32	0	0%			
Beheer	HA	14.458	16.382	113%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	10	4	40%	1.746	343	20%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	143	10	7%			
Totaal Euro	€				3.007	17	1%
4 Landschap							
Inrichten	HA	200	205	103%	6.200	18.256	294%
Inrichten	KM	620	0	0%			
Beheer	HA	202	1.855		0	0	
Overig landschap	HA	0	0		8.309	0	40%
Overig landschap	AANT	0	0			2.724	
Overig landschap	OPP	1	0	0%		624	
Totaal Euro	€				14.509	21.604	149%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				450	129	29%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				6.916	946	14%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	7.012	352	5%			
Totaal aantallen	AANT	615	45	7%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				75.280	55.150	73%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	443	53%
Totaal Euro	€				366.451	249.912	68%
Financiering PNB/POP BBL					-41.375	-13.839	
Totaal via ILG					325.076	236.073	

Noord Brabant	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur							
Verwerving	HA	2.853	2.765	97%	96.943	136.608	141%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	1.112		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	758		0	0	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.648	299	18%	0	0	
Overgedragen	HA	0	1.652		0	0	
Inrichting	HA	9.904	3.029	31%	56.100	14.337	26%
Beheer	HA	52.074	53.412	103%	85.065	42.195	50%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	1.027	52	5%	0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	4	0	0%	16.570	161	1%
Totaal Euro	€				254.678	193.301	77%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	14.063	0	0%	44.420	10.540	24%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	21	158	71%	5.778	3.790	66%
Soortenbescherming	AANT	7	9	129%	1.389	1.106	80%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	9.451	4.699	50%	0	0	
Overig natuur	AANT	4	2	50%	2.460	211	9%
Totaal Euro	€				54.047	15.647	29%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	17.463	4.237	24%	14.250	21.320	150%
Overig landbouw	HA	250	6	2%	9.070	2.735	30%
Duurzaam ondernemen	AANT	4	1	25%	830	128	15%
Totaal Euro	€				24.150	24.183	100%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	7	36		1.292	954	74%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	91	0	0%			
Beheer	HA	26.389	32.502	123%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	18	6	33%	4.175	874	21%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	254	11	4%			
Totaal Euro	€				5.467	1.828	33%
4 Landschap							
Inrichten	HA	748	203	27%	6.330	7.021	111%
Inrichten	KM	331	0	0%			
Beheer	HA	403	1.671		0	0	
Overig landschap	HA	0	0		5.040	2.177	59%
Overig landschap	AANT	2	0	0%		1.509	
Overig landschap	OPP	0	0	0%		-706	
Totaal Euro	€				11.370	10.001	88%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	5	3	60%			
Totaal Euro	€				450	293	65%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	11	0	0%			
Totaal Euro	€				16.321	4.578	28%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	6.499	0	0%			
Totaal aantallen	AANT	267	0	0%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	70	0	0%			
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				86.860	55.642	64%
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	833	100%
Totaal Euro	€				454.177	306.306	67%
Financiering PNB/POP BBL					-71.571	-42.538	
Totaal via ILG					382.606	263.768	

Zeeland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie T/m 2011		BO	Realisatie T/m 2011	
		PE	PE	%	x € 1.000	x € 1.000	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	792	727	92%	13.131	26.997	205%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	83		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	32		0	0	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	820	206	25%	0	0	
Overgedragen	HA	0	292		0	0	
Inrichting	HA	2.124	582	27%	16.100	6.383	40%
Beheer	HA	12.179	10.918	90%	31.988	19.099	60%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	2	2	100%	230	196	85%
Totaal Euro	€				61.449	52.675	86%
Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	2.657	290	11%	8.640	2.336	27%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	7	5	71%	1.630	967	59%
Soortenbescherming	AANT	7	4	57%	1.282	244	19%
Westerschelde	HA	600	385	64%	138.050	40.044	29%
Natuurbeheer buiten EHS	HA	2.224	2.762	124%	0	0	
Overig natuur	AANT	2	4	200%	310	205	66%
Totaal Euro	€				149.912	43.796	29%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	9.018	5.064	56%	5.150	2.927	57%
Overig landbouw	HA	250	260	104%	9.070	6.806	75%
Duurzaam ondernemen	AANT	5	2	40%	830	20	2%
Totaal Euro	€				15.050	9.753	65%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	17	8	47%	359	-34	
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	15	0	0%			
Beheer	HA	707	8.074		0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	5	4	80%	1.280	240	19%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	127	49	39%			
Totaal Euro	€				1.639	206	13%
4 Landschap							
Inrichten	HA	501	387	77%	1.770	1.318	74%
Inrichten	KM	56	0	0%			
Beheer	HA	51	195		0	0	
Overig landschap	HA	0	0		5.446	372	73%
Overig landschap	AANT	0	0			865	
Overig landschap	OPP	1	0	0%		2.756	
Totaal Euro	€				7.216	5.311	74%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	9	5	56%			
Totaal Euro	€				450	68	15%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				5.398	725	13%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	0	
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	1				
Totaal Euro	€				833	100	12%
Totaal Euro	€				241.947	112.634	47%
Financiering PNB/POP BBL					-12.473	-18.220	
Totaal via ILG					229.474	94.414	

Flevoland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO	Realisatie		BO	Realisatie	
		PE	T/m 2011	%	x € 1.000	T/m 2011	%
1 Natuur EHS							
Verwerving	HA	1.172	762	65%	49.385	47.385	96%
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	123		0	0	
Bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln)	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	3	89	2967%	0	0	
Overgedragen	HA	0	695		0	0	
Inrichting	HA	670	513	77%	8.240	2.456	30%
Beheer	HA	5.988	6.513	109%	20.082	8.520	42%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	0	0		0	0	
Totaal Euro	€				77.707	58.361	75%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	1.500	0	0%	5.680	2.883	51%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	0	0		0	0	
Soortenbescherming	AANT	7	6	86%	1.282	281	22%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS	HA	1.008	2.557		0	0	
Overig natuur	AANT	0	0		0	0	
Totaal Euro	€				6.962	3.164	45%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	7.960	1.379	17%	2.990	80	3%
Overig landbouw	HA	0	0		0	0	
Duurzaam ondernemen	AANT	2	0	0%	830	240	29%
Totaal Euro	€				3.820	320	8%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit	HA	0	0		0	0	
Overgedragen	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting (lop. Verpl.)	HA	0	0		1.560	2.416	155%
Inrichting (lop. Verpl.)	KM	0	0				
Beheer	HA	2.738	7.537		0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	1	0	0%	2.707	268	10%
Landelijke routenetwerken	HA/KM	195	64	33%			
Totaal Euro	€				4.267	2.684	63%
4 Landschap							
Inrichten	HA	0	0		520	0	0%
Inrichten	KM	0	0				
Beheer	HA	2	8.871		0	0	
Overig landschap	HA	0	0		1.292	0	71%
Overig landschap	AANT	0	0			923	
Overig landschap	OPP	0	0			0	
Totaal Euro	€				1.812	923	51%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	2	3	150%			
Totaal Euro	€				300	115	38%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	4	52				
Totaal Euro	€				4.459	848	19%
7 Aandachtsgebieden							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	0	
8 Vitaliteit							
Versterken leefbaarheid	AANT	0	4				
Totaal Euro	€				833	306	37%
Totaal Euro	€				100.160	66.721	67%
Financiering PNB/POP BBL					-15.598	-11.370	
Totaal via ILG					84.562	55.351	
