



Ministerie van Defensie

Voortgangsrapportage Programma GrIT Tweede helft 2022

Ministerie van Defensie

30 maart 2023



Inhoud

1	Inleiding	Pag. 3
2	Algemeen	Pag. 4
3	Status Blokken	Pag. 5-7
4	Capaciteit	Pag. 8
5	Kosten	Pag. 9-14
6	Governance	Pag. 15
7	Kwaliteitsmanagement	Pag. 16
8	Risicomanagement en beheersing	Pag. 17-19
9	Regie en invulling samenwerking	Pag. 20
10	Ontwikkelingen DMO/JIVC	Pag. 21
11	Ontwikkelingen consortium	Pag. 22
12	Wet en regelgeving	Pag. 23
13	Communicatiemomenten tweede helft van 2022	Pag. 24



1. Inleiding | Kaders en uitgangspunten

- Deze voortgangsrapportage beslaat de **periode 1-7-2022 t/m 31-12-2022**.
- Grensverleggende IT (GrIT) is een **groot project**.
- Rapportage gebeurt volgens de **Regeling Grote Projecten**.
- De Uitgangspuntennotitie¹ vormt met Regeling Grote Projecten de **leidraad voor voortgangsrapportage**.
- Voortgangsrapportage volgt opzet Hoofdstuk 5 van de Basisrapportage en de lijn van de Voortgangsrapportage 2022-1 met **mutaties en de actuele stand van zaken**.



2. Algemeen | Het programma boekt voortgang op een lager tempo en met voldoende budget

- **Programma boekt voortgang** met 26 blokken en 1 project in voorbereiding, initiatie of realisatie en 1 blok in uitrol.
- **Tempo ligt lager** dan vooraf gepland:
 - Dit wordt veroorzaakt door de benodigde tijd in de initiatiefase en uitdagingen omtrent personele capaciteit.
 - Programma werkt aan oplossingen en mitigerende maatregelen en weegt consequenties af voor GrIT en andere programma's van Defensie.
- **Voldoende budget beschikbaar** in het Defensie Lifecycle Plan (DLP) op peildatum 31 december 2022:
 - Kostenstijging in zowel realisatie en exploitatie door meerkosten in de bouw/exploitatie, afroep van opties en indexatie van de middelloonsommen.
 - Kostendaling door verschuiving in de blokkenplanning.
 - Defensie en het consortium hebben gezamenlijk inzicht in de afwijking in de prijsspecificatie. De uitwerking van de consequenties van deze afwijking wordt in de eerste helft van 2023 uitgevoerd.
- **De reorganisatie van JIVC¹ zal in Q2 2023 plaatsvinden** waarmee de beheerorganisatie voor GrIT wordt ingebed.
- **De beoogde splitsing van Atos zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 plaatsvinden.** In de eerste helft van 2023 vinden gesprekken plaats over eventuele consequenties voor Defensie en GrIT.



3. Status Blokken | Meer dan de helft blokken in behandeling; eerste blok wordt uitgerold voor gebruikers (1/3)

Status blokken 31-12-2022

Housing	Operationele Compartimenten & Modules Ontplood	Private Cloud Platform	Migratie Keep Applications	Connectivity	Modern Werkplek-omgeving	Mobiele Netwerken	Unified Comms.	IT Security	IT Operations	GES (opt.)
BR-025 R Twin DC	BR-028 T Operationele compartimenten	BR-014 R tot 017 Private Cloud Platform	BR-036 R HGI	BR-010 R Protected Core Network	BR-007 N Individual Workplace	BR-001 R Defensie Mobile Netwerk	BR-002 I Unified Comms.	BR-021 I Security Operations Center	Project beheer-processen R	BR-030 N Information Mngmt.
BR-026 I Uitwijk DC	BR-029 R Modules Ontplood		BR-037 R Ontplood	BR-011 N Local Area Network	BR-008 N IT Basis Toepassingen		BR-003 N Contact Center	BR-022 I Identity & Access mgmt.	BR-018 I IT Service mgmt.	BR-031 N Enterprise Int. Services
	BR-020 N Yellow Domain		BR-038 I LANTEK	BR-012 * I IODL	BR-009 N Collab. & Comm. Services		BR-004 I Operational Chat	BR-023 R Information Exchange Gateway	BR-019 I IT Operational mgmt.	BR-032 N Data analytics visualisatie
			BR-039 I Confi	BR-013 * I Welfare			BR-005 I Critical Comms.	BR-024 I IT-toegangscontrole		BR-033 N Ent. Search & Language Support
			BR-040 I LGI							
			BR-041 I KMAR							
			BR-042 I Medisch							
			BR-043 I Complex							

N = Nog te starten
I = Initiatie
R = Realisatie
U = Uitrol
T = Ter Beschikkingstelling

Vetgedrukt gewijzigd t.o.v. vorige rapportage
* Buiten programma door Defensie uitgevoerd


Toelichting status blokken (1/3)

- Er zijn **26 blokken en één project in voorbereiding, initiatie of realisatie**; dit is een toename van 8 blokken ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022-1.
- Er is **één blok in de uitrol**.
- Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2023 een **geactualiseerde planning opgesteld** waarbij wordt onderzocht op welke wijze de gevolgen van de vertraging in de tweede helft van 2022 kunnen worden opgevangen.
- In november 2022 heeft GrIT de opdracht gekregen de **internationale interoperabiliteit in lijn te brengen met de eisen vanuit Federated Mission Networking Spiral 4**; de gevolgen worden in kaart gebracht in de business case en geactualiseerde planning.
- Doorlooptijd van de **initiatiefase is langer dan gepland**; Het programma onderzoekt mogelijkheden om de doorlooptijd te verkorten (bijv. nieuw format initiatiedocument).



3. Status Blokken | Meer dan de helft blokken in behandeling; eerste blok wordt uitgerold voor gebruikers (2/3)

Status planning 04-01-23

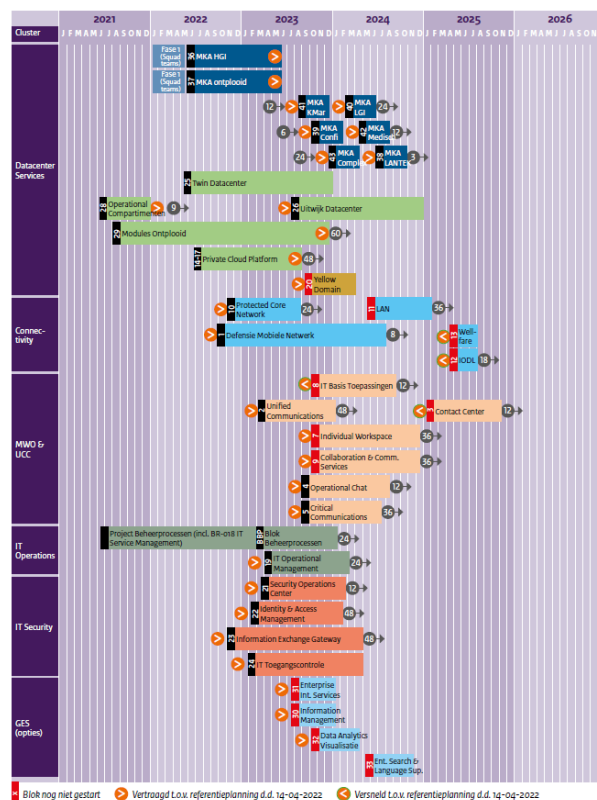


Toelichting status blokken (2/3)

- Operationele Compartimenten (BR-028) is in **TBS-fase** en wordt uitgerold; uitrol is vertraagd.
- Defensie Mobile Network (BR-001), Protected Core Network (BR-010), de vier Private Cloud blokken¹ (BR-014, BR-015, BR-016 en BR-017, Information Exchange Gateway (BR-023), Modules Ontplooid (BR-029), Migratie Keep Applicaties Hoogerubriceerde Informatievoorziening (MKA HGI)(BR-036), MKA Ontplooid (BR-037) en het Twin Datacenter (BR-025) bevinden zich in de **realisatiefase**.
- Project Beheer Processen (PBP) zit in de **realisatiefase** en heeft het eerste, van vier, deelproducten opgeleverd; het project is de samenvoeging van het blok IT-Servicemanagement (BR-018), het proces integratie bestaande IT, het proces integratie nieuwe IT en het project Governance, Risk & Compliance.
- Unified Communications (BR-002), Operational Chat (BR-004), Critical Communications (BR-005), Blok Beheer Processen (BBP), IT Operational Management (BR-019), Security Operations Center (BR-021), Identity & Access Management (BR-022), IT Toegangscontrole (BR-024) en Uitwijk Datacentrum (BR-026) zitten in de **initiatiefase**.



3. Status Blokken | Meer dan de helft blokken in behandeling; eerste blok wordt uitgerold voor gebruikers (3/3)

Status planning 04-01-23

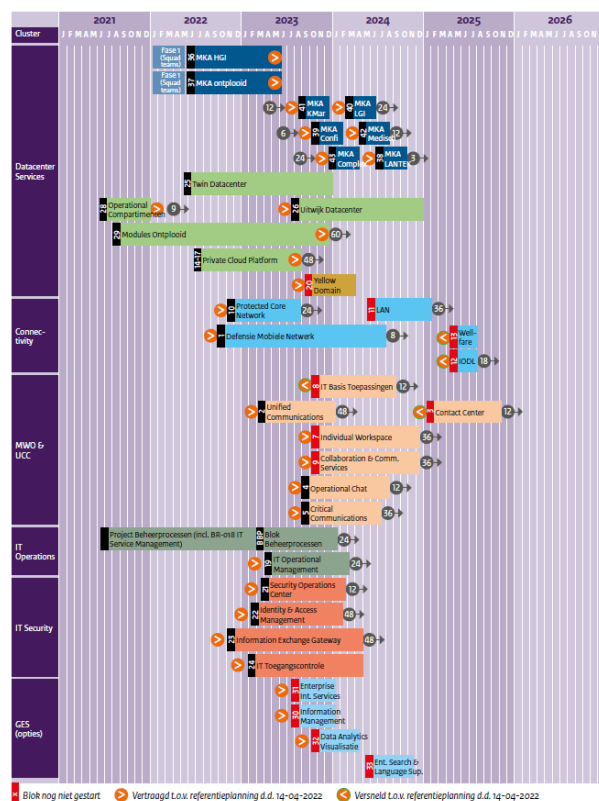

Toelichting status blokken (3/3)

- Besluitvorming over de blokken Operational Chat (BR-004) en Critical Communications (BR-005) vindt plaats **nadat het blok Unified Communications (BR-002) in realisatie is gegaan**; Voortgang van het blok **Uitwijk Datacentrum (BR-026) is vertraagd** vanwege het uitblijven van de benodigde omgevingsvergunning.
- MKA Lantek (BR-038), MKA Confi (BR-039), MKA LGI (BR-040), MKA KMAR (BR-041), MKA Medisch (BR-042) en MKA Complex (BR-043) zijn **gebundeld tot één ID**; Defensie is in de tweede helft van 2022 begonnen met het opstellen hiervan.
- Defensie Mobiele Netwerk (BR-001) heeft zijn **financiële aspecten binnen de kaders** afgedekt en bevindt zich in de realisatiefase. Unified Communications (BR-002) bevindt zich nog in de initiatiefase door **onzekerheid over de continuïteit van de gekozen onderaannemer**; het consortium is gevraagd hiervoor mitigerende maatregelen, inclusief een fall-back scenario, op te stellen.
- In de prijsspecificatie is **structureel te weinig hardware ingerekend** in de blokken BR-014 - BR017 en BR-029 om blok BR-002 te ondersteunen; de prijsspecificatie betreft ook andere blokken. In de tweede helft van 2022 is gestart met de uitwerking van de consequenties en begin 2023 volgt overleg met het consortium over de wijze waarop de verantwoordelijkheden worden verdeeld.



4. Capaciteit | Continue effort in het verkrijgen van voldoende personele capaciteit

- In de tweede helft van 2022 was vanuit Defensie **onvoldoende personele capaciteit beschikbaar** om aan de volledige behoefte vanuit de blokken te voldoen, met als gevolg dat het tempo van de uitvoering van het programma lager lag dan gepland.
- Defensie heeft daarom **capaciteitssessies georganiseerd** om in kaart te brengen **welke IT-medewerkers benodigd en beschikbaar zijn** voor de realisatie van de blokken en welke verdringingseffecten in de huidige IT optreden als GrIT deze medewerkers toebedeeld krijgt.
- De Stuurgroep Digitale Transformatie besluit omtrent de verdringingseffecten in het eerste kwartaal van 2023, waarna de **definitieve capaciteitstoewijzing** plaatsvindt en de **geactualiseerde planning** opgesteld kan worden.



5. Kosten | Ontwikkelingen realisatie, exploitatie en DLP-budget

- 1 Geplande **kosten realisatie zijn met € 7,0 miljoen toegenomen** door meerkosten in bouw, afroep van opties en indexatie arbeidsvoorwaardenakkoord en daling door verschuiving in de planning.
- 2 Geplande **exploitatiekosten zijn met € 23,3 miljoen toegenomen** door meerkosten, afroepen van opties, gewijzigde planning (daling), verschuiving naar programmakosten (daling) en indexatie arbeidsvoorwaardenakkoord.
- 3 **Totaalbudget ten behoeve van GrIT is met € 40,1 miljoen toegenomen** door bijstelling personeelsbudget en overheveling van budget vanuit een ander DLP-project.
- 4 **Gerealiseerde kosten van GrIT in 2022 zijn in totaal € 113,2 miljoen**, waarvan € 87,0 miljoen is uitgegeven aan de realisatiefase en € 26,2 miljoen aan de TBS-fase van blokken.



5. Kosten | Geplande kosten realisatie zijn met € 7 miljoen toegenomen door meerkosten in bouw, afroep van opties en budgetverschuiving (1/2)

Financiële ontwikkeling realisatiekosten



Toelichting financiële ontwikkeling (1/2)

- De **geplande kosten voor realisatie van het programma zijn met € 7,0 miljoen toegenomen**, door meerkosten in de bouw, afroep van opties, verschuiving in de planning (daling), verschuiving van kosten uit exploitatie en indexatie van de middelloonsommen.
- Bij de realisatie van de blokken zijn t.o.v. de vorige voortgangsrapportage **extra kosten ontstaan van € 9,5 miljoen**, die volledig worden gefinancierd uit de risicoreservering van het programma.
- Bij de realisatie van de blokken zijn t.o.v. de vorige voortgangsrapportage **extra kosten ontstaan van € 1,6 miljoen** als het gevolg van het **afroepen van opties**; deze kosten worden volledig gefinancierd uit de vrije ruimte van het programma.
- Daartegenover staan geraamde **lagere kosten van € 9,1 miljoen als gevolg van verschuivingen in de planning**; dit bedrag wordt toegevoegd aan de vrije ruimte.
- Defensie zal data diodes om veiligheidsredenen zelf aanschaffen; hierdoor **stijgt de initiële investering met € 1,1 miljoen**, hiertegenover **staat een daling van € 1,1 miljoen in de exploitatiekosten**.
- Als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord is de **totale kostenindexatie berekend op € 3,9 miljoen**; hiertegenover staat dat het personeelsbudget met gelijke omvang is toegenomen.



5. Kosten | Geplande kosten realisatie zijn met € 7 miljoen toegenomen door meerkosten in bouw, afroep van opties en budgetverschuiving (2/2)

Financiële ontwikkeling realisatiekosten

Toelichting financiële ontwikkeling (2/2)



- **Overige programmakosten:** De gemaakte kosten voor het transitiemanagement vallen binnen het budget. De kostenstijging voor de dubbele beheerlasten en de inzet van Defensie in de gemengde teams is op basis van de huidige inzichten afgerond nihil. De uitgaven schuiven in de tijd op als gevolg van aanpassingen in de planning.
- **Risicoreservering:** De risicoreservering neemt als gevolg van bovenstaande uitputting af met € 9,5 miljoen. Na actualisatie van de risico-inschatting van het programma blijft de resterende risicoreservering per 31-12-2022 groter dan de totale verwachtingswaarde van de geïdentificeerde risico's. In de commercieel vertrouwelijke bijlage wordt dit in detail toegelicht.



5. Kosten | Exploitatiekosten met € 23,3 miljoen toegenomen, voornamelijk door meerkosten en een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord

Financiële ontwikkeling exploitatiekosten



Toelichting financiële ontwikkeling

- **De geplande kosten voor exploitatie zijn toegenomen met € 23,3 miljoen** in de tweede helft van 2022 per saldo door meerkosten, het afroepen van opties, verschuiving van de planning, verschuiving naar programmakosten en een indexatie door het arbeidsvoorwaardenakkoord.
- Binnen de totale exploitatiekosten (t/m 2030) van GrIT zijn **meerkosten opgetreden van € 17,5 miljoen**, die uit de vrije ruimte worden gefinancierd; dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanpassingen in het uitvoeringsplan van BR-001 (Defensie Mobiel Netwerk).
- Er zijn binnen de exploitatie van twee blokken **opties afgeroepen voor € 3,7 miljoen**; voor ca. € 1,1 miljoen is budget vanuit een ander DLP-project overgeheveld, het resterende saldo komt vanuit de vrije ruimte.
- Als gevolg van **verschuivingen in de planning** stijgen de kosten voor het beheer van de huidige IT met circa € 70,3 miljoen en dalen de kosten voor het beheer van de nieuwe IT met circa € 101,9 miljoen. **Per saldo dalen de kosten ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage met € 31,6 miljoen**; dit bedrag wordt toegevoegd aan de vrije ruimte.
- Afspraken over **data diodes leiden tot daling van € 1,1 miljoen**
- Door een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord en middelloonsommen **stijgt de waarde van de SOK in de exploitatiefase met € 34,8 miljoen**; het personeelsbudget is met dezelfde omvang is toegenomen.



5. Kosten | Totaalbudget GrIT in DLP toegenomen met € 40,1 mln door bijstelling personeelsbudget en overheveling ander DLP-project

Budget overzicht		Toelichting financiële ontwikkeling
Component	Bedrag	
Totaalbudget GrIT in Basisrapportage (30-06-2022)	€ 3.152,1 mln.	<ul style="list-style-type: none">• Totale kosten stijgen t/m 2030 naar € 3.192,2 miljoen.• Totale effect bijstelling personeelsbudget en overheveling vanuit een ander DLP-project bedraagt € 40,1 miljoen.• Positief verschil tussen geschatte kosten en totaalbudget GrIT in het DLP wordt aangegeven als vrije ruimte.
Toename budget	€ 40,1 mln.	
Totaalbudget GrIT (31-12-2022)	€ 3.192,2 mln.	



5. Kosten | Verplichtingen en kasuitgaven binnen scope Grensverleggende IT in 2022

Deelfasen	Openstaand per 31-12-21	Aangegaan in 2022	Betaald in 2022	Openstaand per 31-12-22
Realisatiefase	96,1	110,3	87,0	119,4
Terbeschikkingstellings-fase	2,0	107,1	26,2	82,9
Totaal	98,1	217,4	113,2	202,3

Verplichtingen binnen investeringen

- Op het project **Grensverleggende IT is gedurende 2022 in totaal € 87,0 miljoen betaald**; Hiervan is € 75,1 miljoen uitgegeven aan de activiteiten die zijn uitgevoerd door het consortium inzake de realisatie van de blokken en in de terbeschikkingstellingsfase van het project is gedurende 2022 in totaal € 26,2 miljoen betaald.
- In de vertrouwelijke bijlage wordt nader ingegaan op de toelichting bij bovenstaande tabel.



6. Governance | AcICT zal starten met een BIT-toets op GrIT; hiervoor heeft de CIO al een tussentijds oordeel uitgegeven

Update governance

- Governance is op hoofdlijnen ongewijzigd. Binnen de programmaorganisatie is ten behoeve van de aansturing van de blokken bij het **Operationeel Programma Overleg** een optimalisatie doorgevoerd.
- Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) zal in de eerste helft van 2023 **starten met een BIT-toets** op de uitvoering van programma GrIT.
- In aanloop hierop heeft de CIO in de tweede helft van 2022 een **tussentijds CIO-oordeel** uitgegeven over het programma GrIT. Hierin zijn aanbevelingen opgenomen die het programma GrIT momenteel aan het verwerken is.



7. Kwaliteitsmanagement | GrIT heeft in de tweede helft van 2022 de processen kwaliteitsmanagement (QA) verder verbeterd

Update kwaliteitsmanagement

- De programmaorganisatie GrIT heeft in de tweede helft van 2022 de **processen verder verbeterd op het gebied van kwaliteitsmanagement**, Quality Assurance (QA)
- QA heeft **positieve verwachtingen van de werking van de vastgestelde test – en acceptatie procedure** en de integrale bewaking van de afbouw van de huidige IT-infrastructuur na verwerving van een dedicated projectleider
- De CIO en een derde partij hebben tijdens reviews vastgesteld dat het **aangepaste reviewproces tot structurele kwalitatieve verbeteringen heeft geleid** in de op te leveren documenten al blijft de doorlooptijd hiervan significant



8. Risicomanagement en beheersing | Risicomanagement is verder ontwikkeld door o.a. het opstellen van kaders voor risicobereidheid

Toelichting

- Risicomanagement en -beheersing is gedurende Q2 2022 verder ontwikkeld, onder meer door het **opstellen van kaders voor risicobereidheid**.
- De risico's worden **regelmatig geactualiseerd en elk kwartaal getoetst aan de risicoreservering**, wat heeft geleid tot het vervallen van één hoofdrisico (weerstand tegen veranderingen) en de bijstelling van de financiële impact bij twee hoofdrisico's.
- In de komende periode geeft risicomanagement **extra aandacht voor rolvastheid van de stakeholders** in het programma.



8. Risicomanagement en beheersing | Grotere kans op beïnvloeding door externe factoren (1/2)

Overzicht risico's 1/2



Defensie is onvoldoende in staat regie te voeren: Onvoldoende regie betekent dat Defensie haar verantwoordelijkheden vanuit de samenwerkingsovereenkomst met het consortium niet of niet voldoende kan vervullen. Dit leidt mogelijk tot wijzigingen met hogere vergoedingen en/of het opschuiven van mijlpalen. Mitigatie door: aanscherping reviewproces voor producten uit initiatiefase, invulling openstaande vacatures ingevuld, inhuur specifieke expertisegebieden.



Schaarste aan personele capaciteit: Dit risico is voor een deel van het programma opgetreden. De kans van optreden van dit risico voor het vervolg van het programma is gelijk gehouden. De financiële impact is als gevolg van de mitigerende acties verlaagd naar zeer klein, omdat de meerkosten reeds uit de vrije ruimte zijn gehaald. Binnen Defensie is een capaciteitsproces ingericht om vroegtijdig dergelijke knelpunten te signaleren. In enkele gevallen kan dit capaciteitstekort van Defensie opgevangen worden door inzet van extra capaciteit vanuit het consortium.



Chip-schaarste en lange levertijden: Gezien de geopolitieke verhoudingen blijft het risico qua kans en impact vooralsnog ongewijzigd. Voor het programma is besloten de benodigde hardware vroegtijdig (op basis van garantstelling) te bestellen waardoor vooralsnog geen knelpunten zijn ontstaan in realisatie van de blokken. Dit voorkomt extra vertragingen.



Technologische ontwikkelingen en actuele behoefte Defensie leiden tot wijzigingen in onder andere het Technisch Ontwerp: Het risico is qua kans en impact ongewijzigd. De IT en behoeftes van Defensie blijven zich in een hoog tempo ontwikkelen. Voor opdrachtverstrekking wordt gecontroleerd welke producten gebruikt gaan worden en of deze nog steeds toekomstbestendig zijn. Inmiddels is gebleken dat het aantal VtW's (changes) groter is dan verwacht. In verband hiermee zullen maatregelen moeten worden geïdentificeerd om de scope van GrIT te blijven beheersen.



8. Risicomanagement en beheersing | Grotere kans op beïnvloeding door externe factoren (2/2)

Overzicht risico's 2/2



Contractuele geschillen: De kans is verhoogd naar gemiddeld. Gesprekken over de blokoverschrijdende afwijkingen van de prijsspecificaties verhogen de kans op spanningen en geschillen. De financiële impact blijft zeer groot ondanks het feit dat financiering van dit risico voor Blok BR-001 inmiddels uit de risicoreservering heeft plaatsgevonden. Om de kans op conflicten te verminderen worden mogelijke belangenconflicten vroegtijdig besproken en waar nodig geëscaleerd. Daarnaast zijn er maatregelen als cultural fit-programma's, onboardings- en specifieke heisessies.



Baten worden niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd: Het risico is ongewijzigd. Om tijdige afbouw te borgen is de afbouw van de huidige IT-infrastructuur benoemd als programmaverantwoordelijkheid en is capaciteit hiervoor beschikbaar gesteld per 01-01-2023.



Weerstand tegen veranderingen: Dit risico is vervallen. Met geïmplementeerde maatregelen zoals informatiesessies, het in oktober getekende reorganisatieplan van JIVC en communicatie is het financiële risico nihil. Daarmee is dit risico geen hoofd risico meer en komt daarmee te vervallen. Het restrisico van ongewenst verloop vanwege niet op te lossen cultuurverschillen in de samenwerking is opgenomen in hoofd risico 2.



Externe factoren: De kans en impact op het risico externe factoren zijn gelijk gebleven, ondanks het vervallen van COVID-effecten in de samenwerking. Het risico van het verkrijgen van omgevingsvergunningen is gehandhaafd, maar loopt nog inzake de verbouwing van het uitwijkdatacenter (BR-026). Het effect van COVID zien wij niet meer als risico aangezien de omgang daarmee een routine is geworden. De inschatting van het risico van de gewijzigde wereldorde is niet gewijzigd ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage.



9. Regie en invulling samenwerking | Programmaorganisatie is versterkt en richt zich hoofdzakelijk op de realisatie van GrIT

Update regie en invulling samenwerking

- **De programmaorganisatie is versterkt**, vooral door middel van inbedding van educatie en cultuur, uitbreiding van het leveranciersmanagement, kwaliteitsmanagement en de programmamanagement organisatie (PMO). Met deze versterking is zowel de regie binnen het programma alsmede de afstemming met de Bestuursstaf en het consortium verbeterd.
- De regie op de samenwerking met het consortium is ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog hoofdzakelijk **gericht op de realisatie van GrIT**. Met de start van de dienstverlening in de terbeschikkingstellingsfase zal de regie op de samenwerking over zowel de programmaorganisatie GrIT als de lijnorganisatie binnen JIVC plaatsvinden. Met de inrichting van de gemengde afdeling Generieke Infrastructuur Services (GIS) wordt hier invulling aan gegeven.



10. Ontwikkelingen DMO/JIVC | Ontwikkeling GIS is voortgezet en DMO/JIVC werkt aan de bekendheid bij haar medewerkers

Update ontwikkelingen DMO/JIVC

- De **ontwikkeling en inrichting van de nieuwe afdeling** Generieke Infrastructuur Services (GIS) is in de tweede helft van 2022 voortgezet.
- DMO/JIVC werkt aan de **bekendheid van de afdeling GIS bij medewerkers van DMO/JIVC**, in het bijzonder van de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GII) en is een programma gestart om medewerkers voor te bereiden op een functie bij GIS, onder ander door opleidingen en introductie van de nieuwe IT-systemen.



11. Ontwikkelingen consortium | Atos heeft kenbaar gemaakt de organisatie op te splitsen in de tweede helft van 2023

Update ontwikkelingen consortium

- Na de afsplitsing van Kyndryl van IBM heeft nu **Atos kenbaar gemaakt de organisatie te gaan opsplitsen**. Atos is voornemens om te splitsen in twee entiteiten, te weten:
 - **Atos** met daarin de divisies Data Centre and Hosting, Digital Workplace, Unified Communications en Business Process Outsourcing;
 - **Evidian** met daarin de Digital-, Big Data- en Securitytakken.
- De **beoogde splitsing dient in de tweede helft van 2023** plaats te vinden.
- In de eerste helft van 2023 vinden gesprekken plaats over **eventuele consequenties voor Defensie en GrIT** in het bijzonder.



12. Wet en regelgeving | Uitspraak over stikstofvrijstelling leidt tot noodzakelijke extra berekeningen voor de vergunning van blok BR-026

Update wet en regelgeving

- Uitspraak 202107079/1/R4 d.d. 2 november 2022 van de Raad van State stelt dat de **stikstofvrijstelling voor de bouw niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht**.
- Het gevolg van deze uitspraak is dat voor de uitwijklocatie alsnog **aanvullende stikstof berekeningen gemaakt moeten worden** voordat de vergunning kan worden verleend. Dit impliceert extra vertraging van de start van de realisatie van blok BR-026.



13. Communicatiemomenten tweede helft van 2022 | Periodieke informatievoorziening aan Kamer

Tijdslijn communicatiemomenten

